

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants NF X46-035



Numéro de rapport	(DIAG P) 27073077 - CASERNE AULT - BÂTIMENT 02
Propriétaire	RGHF/DAO/BIL
	Section de l'immobilier et du logement Amiens
	107 rue d'Elbeuf - 80 000 AMIENS
Donneur d'ordre	Audrey FRUGIER
Adresse de l'immeuble	Caserne AULT - Bâtiment 02 - Logements
	66 avenue Général Leclerc 80460 AULT
Bâtiment ou installation	Bâtiment 02 : Logements
Date de la commande	20/03/2025
La ou le(s) date(s) de la visite	18/12/2025
Date d'édition du rapport de repérage	31/12/2025
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	74

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise



Opérateur de repérage :

Monsieur BECART Julien
BUREAU VERITAS EXPLOITATION
11 rue Léon Blum
62800 LIÉVIN
Le 31/12/2025

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE :	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE	4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X	7
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS)	8
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	8
METHODOLOGIE EMPLOYEE	8
INTERPRETATION DES RESULTATS	11
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	11
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES	11
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	65
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	71
ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE	73

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **(DIAG P) 27073077 - CASERNE AULT - BÂTIMENT 02**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	RGHF/DAO/BIL Section de l'immobilier et du logement Amiens
Demeurant :	107 rue d'Elbeuf - 80 000 AMIENS
Donneur d'ordre du repérage :	Audrey FRUGIER
Contact :	Mobile : 06 08 75 89 52 audrey.frugier@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur BECART Julien
Nom et adresse de l'entreprise :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION 11 rue Léon Blum 62800 LIÉVIN
N° de Siret :	
RCP-compagnie-n° de police :	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - FRL001575

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	Caserne AULT
Adresse complète :	66 avenue Général Leclerc 80460 AULT
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : /	Construction :
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment Logement	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.5 Liste des documents remis :

Type de document
Plans

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

- Rénovation générale du bâtiment.

3	Elément de la mission de repérage
----------	--

3.1	Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :
------------	--

Local	Étage	Visité	Justification de non-visite
Local 1	SOUS-SOL	OUI	
Local 2	SOUS-SOL	OUI	
Local 3	SOUS-SOL	OUI	
Local 4	SOUS-SOL	OUI	
Local 5	SOUS-SOL	OUI	
Local 6	SOUS-SOL	OUI	
Local 7	SOUS-SOL	OUI	
Local 8	SOUS-SOL	OUI	
Local 9	SOUS-SOL	OUI	
Local 10	SOUS-SOL	OUI	
Local 11	SOUS-SOL	OUI	
Local 12	SOUS-SOL	OUI	
Local 13	SOUS-SOL	OUI	
Local 14	SOUS-SOL	OUI	
Local 15	SOUS-SOL	OUI	
Local 16	SOUS-SOL	OUI	
Local 17	SOUS-SOL	OUI	
Local 18	SOUS-SOL	OUI	
Local 19	SOUS-SOL	OUI	
Local 27	RDC	OUI	
Local 28	RDC	OUI	
Local 29	RDC	OUI	
Local 30	RDC	OUI	
Logement Gauche	RDC	OUI	
Local 14	RDC	OUI	
Local 15	RDC	OUI	
Local 16	RDC	OUI	
Local 17	RDC	OUI	
Local 18	RDC	OUI	
Local 19	RDC	OUI	
Local 20	RDC	OUI	
Local 21	RDC	OUI	
Local 22	RDC	OUI	
Local 23	RDC	OUI	
Local 24	RDC	OUI	
Local 25	RDC	OUI	
Local 26	RDC	OUI	
Logement Droite	RDC	OUI	
Local 1	RDC	OUI	
Local 2	RDC	OUI	
Local 3	RDC	OUI	
Local 4	RDC	OUI	
Local 5	RDC	OUI	
Local 6	RDC	OUI	
Local 7	RDC	OUI	
Local 8	RDC	OUI	
Local 9	RDC	OUI	
Local 10	RDC	OUI	
Local 11	RDC	OUI	
Local 12	RDC	OUI	

Local 13	RDC	OUI	
Local 30	R+1	OUI	
Local 31	R+1	OUI	
Local 32	R+1	OUI	
Local 33	R+1	OUI	
Logement Gauche	R+1	OUI	
Local 17	R+1	OUI	
Local 18	R+1	OUI	
Local 19	R+1	OUI	
Local 20	R+1	OUI	
Local 21	R+1	OUI	
Local 22	R+1	OUI	
Local 23	R+1	OUI	
Local 24	R+1	OUI	
Local 25	R+1	OUI	
Local 26	R+1	OUI	
Local 27	R+1	OUI	
Local 28	R+1	OUI	
Local 29	R+1	OUI	
Logement Droite	R+1	OUI	
Local 1	R+1	OUI	
Local 2	R+1	OUI	
Local 3	R+1	OUI	
Local 4	R+1	OUI	
Local 5	R+1	OUI	
Local 6	R+1	OUI	
Local 7	R+1	OUI	
Local 8	R+1	OUI	
Local 9	R+1	OUI	
Local 10	R+1	OUI	
Local 11	R+1	OUI	
Local 12	R+1	OUI	
Local 13	R+1	OUI	
Local 14	R+1	OUI	
Local 15	R+1	OUI	
Local 16	R+1	OUI	
Local 30	R+2	OUI	
Local 31	R+2	OUI	
Local 32	R+2	OUI	
Local 33	R+2	OUI	
Logement Gauche	R+2	OUI	
Local 17	R+2	OUI	
Local 18	R+2	OUI	
Local 19	R+2	OUI	
Local 20	R+2	OUI	
Local 21	R+2	OUI	
Local 22	R+2	OUI	
Local 23	R+2	OUI	
Local 24	R+2	OUI	
Local 25	R+2	OUI	
Local 26	R+2	OUI	

Local 27	R+2	OUI	
Local 28	R+2	OUI	
Local 29	R+2	OUI	
Logement Droite	R+2	OUI	
Local 1	R+2	OUI	
Local 2	R+2	OUI	
Local 3	R+2	OUI	
Local 4	R+2	OUI	
Local 5	R+2	OUI	
Local 6	R+2	OUI	
Local 7	R+2	OUI	
Local 8	R+2	OUI	
Local 9	R+2	OUI	
Local 10	R+2	OUI	
Local 11	R+2	OUI	
Local 12	R+2	OUI	
Local 13	R+2	OUI	
Local 14	R+2	OUI	
Local 15	R+2	OUI	
Local 16	R+2	OUI	
Local 1	R+3	OUI	
Local 2	R+3	OUI	
Local 3	R+3	OUI	
Local 4	R+3	OUI	
Local 5	R+3	OUI	
Local 6	R+3	OUI	
Local 7	R+3	OUI	
Zone extérieure	/	OUI	
Façade Avant	Zone extérieure	OUI	
Façade Arrière	Zone extérieure	OUI	
Façade Gauche	Zone extérieure	OUI	
Façade Droite	Zone extérieure	OUI	
Toiture	Zone extérieure	OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X			
Marque :	Heuresis		
Modèle :	Pb200i		
Numéro de série :	8027		
Date de changement de source :	07/03/2023		
Nature du radionucléide :	Co57		
Activité de la source :	185 Mbq		
Limite de quantification de l'appareil	0,31 mg/cm ²		
Étalon 1		Étalon 2	
Fabricant de l'étalon : NIST		Fabricant de l'étalon : NIST	
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm ²		Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm ²	
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm ²		Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm ²	
N° NIST de l'étalon : SRM2575		N° NIST de l'étalon : SRM2574	

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)				
N° de mesure	valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie (mg/cm ²)	Date	Observation
1	0,31	0,02	18/12/2025	Vérification de justesse de début de diagnostic
2	0,62	0,08	18/12/2025	Vérification de justesse de début de diagnostic
/	0,33	0,02	19/12/2025	Vérification de justesse intermédiaire diagnostic
/	0,63	0,08	19/12/2025	Vérification de justesse intermédiaire diagnostic
1103	0,35	0,02	19/12/2025	Vérification de justesse de fin de diagnostic
1104	0,64	0,08	19/12/2025	Vérification de justesse de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique	
Nom :	
Adresse :	
Numéro d'accréditation :	

4 Méthodologie Employée
<u>Vérification de justesse de l'appareil à fluorescence X</u> Avant chaque constat, l'auteur vérifie la justesse de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil. <u>Identification du bien objet de la mission</u> L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble. <u>Identification des locaux</u> Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts : – chaque palier ; – chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ; Une gaine d'ascenseur est considérée comme un seul local <u>Identification des zones</u> Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local. Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire. Une unité de repérage est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène. Chaque unité de repérage (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de repérage et substrat

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage se définit à minima avec les critères suivants :

- Niveau (rez de chaussée, étage X...) ;
- Le local ;
- La zone ;
- Produit ou matériau ;
- Le substrat ;
- Le revêtement.

Dans chaque local, toutes les surfaces concernées par les travaux susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Constituent des unités de repérage distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;

- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'un façade (unité de repérage discontinue) ;

Conformément à la NF X 46-035, sont exclus du présent repérage :

- Les PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits...) ;
- Le polystyrène
- Les carrelages, faïences et plinthes carrelées

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Il est effectué à minima 2 mesures dont à minima 1 mesure par local, par unité de repérage, à l'aide de l'appareil à fluorescence X

4.1 Interprétation des résultats

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats des mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur mesurée et l'incertitude de mesure élargie (ex : 13,4 +/- 0,41).

Toute mesure < à la LQ de l'appareil (0,31 mg/cm²) doit être interprétée comme étant inférieure à 0,31 mg/cm².

4.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb, dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

5 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet de mesures sont classées dans le tableau des mesures suivant.

Local 1 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
3	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,14	
/	A	Porte Bâti	aluminium	Peinture				Elément postérieur à 1949
/	A	Porte Ouvrant	aluminium	Peinture				Elément postérieur à 1949
4	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,18	0,13	
5	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,12	0,15	
6	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,16	
8	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	HD	0,22	0,15	
9	Plafond	Plafond Sous-face d'escalier	Ciment	Peinture	HD	0,31	0,16	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Cage d'escalier Contre-marches	Marbre	Non peint				Non peint
10	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Droite	Métal	Peinture	HD	1,55	0,12	
7	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Gauche	Métal	Peinture	HD	1,71	0,13	
/	Toutes zones	Cage d'escalier Marches	Marbre	Non peint				Non peint
11	Toutes zones	Cage d'escalier Muret central	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,14	
/	Toutes zones	Cage d'escalier Plinthes	Marbre	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 2 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
12	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,16	0,18	
/	A	Porte Bâti	aluminium	Peinture				Elément postérieur à 1949
/	A	Porte Ouvrant	aluminium	Peinture				Elément postérieur à 1949
13	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,39	0,15	
14	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,16	0,16	
15	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,34	0,14	
16	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,14	
17	Plafond	Plafond Sous-face d'escalier	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,14	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Cage d'escalier Contre-marches	Marbre	Non peint				Non peint
20	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Droite	Métal	Peinture	HD	1,49	0,12	
19	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Gauche	Métal	Peinture	HD	1,81	0,13	
/	Toutes zones	Cage d'escalier Marches	Marbre	Non peint				Non peint
18	Toutes zones	Cage d'escalier Muret central	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,14	
/	Toutes zones	Cage d'escalier Plinthes	Marbre	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 3 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
21	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,27	0,18	
/	A	Porte Bâti	aluminium	Peinture				Elément postérieur à 1949
/	A	Porte Ouvrant	aluminium	Peinture				Elément postérieur à 1949
22	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,17	
23	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,17	
24	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,16	0,16	
25	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,15	
26	Plafond	Plafond Sous-face d'escalier	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,16	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Cage d'escalier Contre-marches	Marbre	Non peint				Non peint
29	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Droite	Métal	Peinture	HD	1,39	0,14	
28	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Gauche	Métal	Peinture	HD	1,66	0,12	
/	Toutes zones	Cage d'escalier Marches	Marbre	Non peint				Non peint
27	Toutes zones	Cage d'escalier Muret central	Ciment	Peinture	HD	0,18	0,14	
/	Toutes zones	Cage d'escalier Plinthes	Marbre	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 4 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
30	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,38	0,16	
/	A	Porte Bâti	aluminium	Peinture				Elément postérieur à 1949
/	A	Porte Ouvrant	aluminium	Peinture				Elément postérieur à 1949
31	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,18	
32	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,14	0,17	
33	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,12	0,17	
34	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,18	
35	Plafond	Plafond Sous-face d'escalier	Ciment	Peinture	HD	0,19	0,16	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Cage d'escalier Contre-marches	Marbre	Non peint				Non peint
38	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Droite	Métal	Peinture	HD	1,59	0,12	
37	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Gauche	Métal	Peinture	HD	1,78	0,13	
/	Toutes zones	Cage d'escalier Marches	Marbre	Non peint				Non peint
36	Toutes zones	Cage d'escalier Muret central	Ciment	Peinture	HD	0,16	0,14	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	Toutes zones	Cage d'escalier Plinthes	Marbre	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 5 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
39	A	Porte n°1 Bâti	Bois	Vernis	HD	0,16	0,13	
40	A	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Vernis	HD	0,12	0,14	
42	A	Porte n°2 - Armoire gauche Bâti	Bois	Vernis	HD	0,16	0,12	
43	A	Porte n°2 - Armoire gauche Ouvrant	Bois	Vernis	HD	0,17	0,13	
44	A	Porte n°3 - Armoire droite Bâti	Bois	Vernis	HD	0,18	0,15	
45	A	Porte n°3 - Armoire droite Ouvrant	Bois	Vernis	HD	0,18	0,16	
/	F	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	G	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	H	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
41	H	Support de tuyauterie	Métal	Peinture	HD	3,05	0,14	
/	Plafond	Plafond	Fibralith	Non peint				Non peint
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 6 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	B	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	C	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	D	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	E	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	Plafond	Plafond	Fibralith	Non peint				Non peint
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 7 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
48	A	Fenêtre Bâti	Métal	Peinture	HD	3,58	0,13	
50	A	Fenêtre Grille de défense	Métal	Peinture	HD	2,76	0,14	
49	A	Fenêtre Ouvrant	Métal	Peinture	HD	3,79	0,18	
/	A	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
46	A	Porte Bâti	Métal	Peinture	HD	0,14	0,13	
47	A	Porte Ouvrant	Métal	Peinture	HD	0,17	0,14	
/	B	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	C	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	D	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	Plafond	Plafond	Fibralith	Non peint				Non peint
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 8 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
/	A	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	A	Porte Bâti	Bois	Non peint				Non peint
/	A	Porte Ouvrant	Bois	Non peint				Non peint
/	B	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	C	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
51	D	Fenêtre Bâti	Métal	Peinture	HD	3,61	0,15	
53	D	Fenêtre Grille de défense	Métal	Peinture	HD	4,05	0,17	
52	D	Fenêtre Ouvrant	Métal	Peinture	HD	3,23	0,16	
/	D	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	Plafond	Plafond	Fibralith	Non peint				Non peint
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 9 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
/	A	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	A	Porte Bâti	Bois	Non peint				Non peint
/	A	Porte Ouvrant	Bois	Non peint				Non peint
/	B	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
54	C	Fenêtre Bâti	Métal	Peinture	HD	2,89	0,17	
56	C	Fenêtre Grille de défense	Métal	Peinture	HD	3,21	0,16	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
55	C	Fenêtre Ouvrant	Métal	Peinture	HD	3,64	0,17	
/	C	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	D	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	Plafond	Plafond	Fibralith	Non peint				Non peint
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 10 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	A	Porte Bâti	Bois	Non peint				Non peint
/	A	Porte Ouvrant	Bois	Non peint				Non peint
/	B	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
57	C	Fenêtre n°1 Bâti	Métal	Peinture	HD	2,89	0,17	
59	C	Fenêtre n°1 Grille de défense	Métal	Peinture	HD	4,23	0,18	
58	C	Fenêtre n°1 Ouvrant	Métal	Peinture	HD	3,73	0,12	
/	C	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
60	D	Fenêtre n°2 Bâti	Métal	Peinture	HD	3,01	0,14	
62	D	Fenêtre n°2 Grille de défense	Métal	Peinture	HD	3,91	0,18	
61	D	Fenêtre n°2 Ouvrant	Métal	Peinture	HD	3,21	0,17	
/	D	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	Plafond	Plafond	Fibralith	Non peint				Non peint
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 11 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	A	Porte Bâti	Bois	Non peint				Non peint
/	A	Porte Ouvrant	Bois	Non peint				Non peint
/	B	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
63	C	Fenêtre Bâti	Métal	Peinture	HD	3,23	0,16	
65	C	Fenêtre Grille de défense	Métal	Peinture	HD	3,96	0,16	
64	C	Fenêtre Ouvrant	Métal	Peinture	HD	2,05	0,17	
/	C	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	D	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	Plafond	Plafond	Fibralith	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 12 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	A	Porte Bâti	Bois	Non peint				Non peint
/	A	Porte Ouvrant	Bois	Non peint				Non peint
/	B	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	C	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	D	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	Plafond	Plafond	Fibralith	Non peint				Non peint
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 13 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	A	Porte Bâti	Bois	Non peint				Non peint
/	A	Porte Ouvrant	Bois	Non peint				Non peint
/	B	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
66	C	Fenêtre Bâti	Métal	Peinture	HD	3,07	0,11	
68	C	Fenêtre Grille de défense	Métal	Peinture	HD	2,98	0,15	
67	C	Fenêtre Ouvrant	Métal	Peinture	HD	2,31	0,13	
/	C	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	D	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	Plafond	Plafond	Fibralith	Non peint				Non peint
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 14 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
69	A	Porte Bâti	Métal	Peinture	HD	1,78	0,15	
70	A	Porte Ouvrant	Métal	Peinture	HD	1,01	0,14	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	B	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
71	C	Fenêtre Bâti	Métal	Peinture	HD	3,54	0,14	
73	C	Fenêtre Grille de défense	Métal	Peinture	HD	4,12	0,17	
72	C	Fenêtre Ouvrant	Métal	Peinture	HD	3,61	0,16	
/	C	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	D	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	Plafond	Plafond	Fibralith	Non peint				Non peint
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 15 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
80	A	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,26	0,16	
84	A	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,14	0,15	
82	A	Fenêtre Grille de défense	Bois	Peinture	HD	4,05	0,17	
81	A	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,13	0,14	
83	A	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,23	0,14	
76	A	Mur	Ciment	Papier peint	HD	0,13	0,18	
74	A	Porte Bâti	Métal	Peinture	HD	0,27	0,16	
75	A	Porte Ouvrant	Métal	Peinture	HD	0,18	0,16	
77	B	Mur	Ciment	Papier peint	HD	0,17	0,17	
78	C	Mur	Ciment	Papier peint	HD	0,14	0,15	
88	D	Coffre horizontal	Bois	Peinture	HD	0,39	0,12	
79	D	Mur	Ciment	Papier peint	HD	0,32	0,18	
86	D	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0,35	0,13	
87	D	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0,14	0,13	
85	D	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,15	0,14	
/	Plafond	Plafond	BA13	Peinture				Substrat postérieur à 1949
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 16 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
89	A	Porte de garage sectionnelle Bâti		Peinture	HD	0,13	0,16	
90	A	Porte de garage sectionnelle Ouvrant		Peinture	HD	0,18	0,15	
/	B	Mur	Ciment	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	C	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	D	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	Plafond	Plafond	Fibralith	Non peint				Non peint
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 17 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
91	A	Porte de garage sectionnelle Bâti		Peinture	HD	0,19	0,15	
92	A	Porte de garage sectionnelle Ouvrant		Peinture	HD	0,18	0,16	
93	B	Fenêtre n°1 Bâti	Métal	Peinture	HD	2,58	0,14	
95	B	Fenêtre n°1 Grille de défense	Métal	Peinture	HD	3,83	0,12	
94	B	Fenêtre n°1 Ouvrant	Métal	Peinture	HD	3,11	0,12	
96	B	Fenêtre n°2 Bâti	Métal	Peinture	HD	2,71	0,12	
98	B	Fenêtre n°2 Grille de défense	Métal	Peinture	HD	4,02	0,16	
97	B	Fenêtre n°2 Ouvrant	Métal	Peinture	HD	2,95	0,13	
/	B	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	C	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	D	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	Plafond	Plafond	Fibralith	Non peint				Non peint
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 18 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
99	A	Porte Bâti	Métal	Peinture	HD	0,12	0,16	
100	A	Porte Ouvrant	Métal	Peinture	HD	0,14	0,15	
/	B	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	C	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	D	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	Plafond	Plafond	Fibralith	Non peint				Non peint
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 19 (R-1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
101	A	Porte Bâti	Métal	Peinture	HD	0,14	0,15	
102	A	Porte Ouvrant	Métal	Peinture	HD	0,17	0,14	
/	B	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	C	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	D	Mur	Ciment	Non peint				Non peint
/	Plafond	Plafond	Fibralth	Non peint				Non peint
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 27 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
103	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,18	
/	A	Porte Bâti	aluminium	Peinture				Elément postérieur à 1949
/	A	Porte Ouvrant	aluminium	Peinture				Elément postérieur à 1949
119	B	Gaine technique - Trappe Bâti	Bois	Peinture	HD	0,21	0,15	
120	B	Gaine technique - Trappe Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,37	0,14	
104	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,14	0,14	
115	B	Porte Armoire électrique n°1 Bâti	Bois	Vernis	HD	0,16	0,12	
116	B	Porte Armoire électrique n°1 Ouvrant	Bois	Vernis	HD	0,17	0,13	
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
113	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,14	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
114	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,17	0,16	
105	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,34	0,17	
121	D	Gaine technique - Trappe Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,12	
122	D	Gaine technique - Trappe Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,37	0,13	
/	D	Mur	Briques	Non peint				Non peint
106	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,14	
117	D	Porte Armoire électrique n°2 Bâti	Bois	Vernis	HD	0,12	0,13	
118	D	Porte Armoire électrique n°2 Ouvrant	Bois	Vernis	HD	0,34	0,15	
107	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	HD	0,09	0,14	
/	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond	Non peint				Non peint
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Cage d'escalier Contre-marches	Marbre	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
112	Toutes zones	Cage d'escalier Garde-corps	Métal	Peinture	HD	0,98	0,14	
111	Toutes zones	Cage d'escalier Limon	Ciment	Peinture	HD	0,19	0,13	
109	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Droite	Métal	Peinture	HD	1,69	0,12	
110	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Gauche	Métal	Peinture	HD	1,81	0,13	
/	Toutes zones	Cage d'escalier Marches	Marbre	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Cage d'escalier Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
108	Toutes zones	Cage d'escalier Sous-face d'escalier	Ciment	Peinture	HD	0,19	0,15	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 14 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
123	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,16	
127	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,17	
130	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,29	0,15	
128	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,12	0,12	
124	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,21	0,18	
125	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,13	
126	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,13	
131	E	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,14	
129	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,16	0,16	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
132	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,18	0,13	
134	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,16	0,14	
133	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,16	0,12	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 15 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
136	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,17	
135	A	Porte Armoire n°1 Bâti	Bois	Peinture	HD	0,19	0,13	
137	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,19	
138	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,38	0,19	
139	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,18	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
140	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,14	0,17	
141	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,18	0,14	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

Local 16 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
142	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,16	
146	A	Porte Armoire n°2 Bâti	Bois	Peinture	HD	0,13	0,17	
143	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,15	
144	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,31	0,12	
145	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,31	0,18	
147	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,16	0,13	
148	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,17	0,13	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

Local 17 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
149	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,18	0,16	
153	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,12	0,12	
154	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,16	0,15	
150	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,12	
157	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,13	
161	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,16	0,13	
158	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,13	
159	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,14	0,14	
160	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,13	0,16	
151	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,27	0,15	
152	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,14	0,15	
155	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,13	0,12	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
156	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,15	0,17	
162	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,14	0,16	
163	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,14	0,16	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

Local 18 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
164	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,17	
168	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,13	
169	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,13	
165	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,16	
170	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,21	0,12	
171	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,32	0,13	
172	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,14	0,12	
173	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,15	
174	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,15	0,14	
166	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,18	
167	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,3	0,19	
175	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,13	0,18	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
176	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,24	0,19	
177	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,15	0,13	
178	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,13	0,14	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 19 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
179	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,18	0,17	
183	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,21	0,13	
184	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,29	0,12	
180	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,16	
185	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,11	0,12	
186	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,12	0,13	
187	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,15	0,12	
188	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,15	
189	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,12	0,14	
181	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,18	
182	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,19	
190	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,13	0,18	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
191	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,18	0,16	
192	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,23	0,14	
193	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,17	0,12	

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

Local 20 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
194	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,18	
198	A	Porte Armoire Bâti	Bois	Peinture	HD	0,18	0,14	
195	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,17	
196	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,16	
197	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,19	
199	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,15	0,19	
200	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,27	0,13	

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

Local 21 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
201	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,3	0,15	
202	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,14	
203	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,15	
204	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,13	
205	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,36	0,12	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
206	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,22	0,14	
207	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,29	0,11	

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

Local 22 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
208	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,13	
212	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,35	0,14	
213	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,14	0,15	
209	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,35	0,13	
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
214	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,18	0,16	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
215	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,16	0,14	
210	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,37	0,17	
211	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,16	
216	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,16	0,19	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Faïence	Faïence	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
220	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,12	0,14	
218	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,12	0,13	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 23 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
221	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,15	
225	A	Porte WC Bâti	Bois	Peinture	HD	0,34	0,15	
226	A	Porte WC Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,18	0,14	
222	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,16	
223	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,18	
224	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,17	
230	D	Trappe GT	Bois	Peinture	HD	0,19	0,13	
227	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,12	0,14	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
229	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,17	0,14	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 24 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
231	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,26	0,15	
235	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,13	0,14	
236	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,16	0,14	
232	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,13	
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
237	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,11	0,12	
238	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,12	0,13	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
239	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,18	0,15	
233	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,14	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	C	Porte-Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
244	C	Porte-Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,13	
/	C	Porte-Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
234	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,12	
240	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,18	0,15	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
241	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,21	0,16	
242	Toutes zones	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0,18	0,17	
245	Toutes zones	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0,12	0,14	
243	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,17	0,12	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 25 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
246	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,13	
250	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,23	0,13	
251	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,14	0,16	
247	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,16	0,12	
252	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,13	
253	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,14	0,12	
254	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,36	0,15	
255	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,14	
256	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,17	0,18	
248	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,19	
249	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,18	
257	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,15	0,13	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
259	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,14	0,14	
260	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,27	0,16	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 26 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
261	A	Façades	Enduit projeté	Peinture	HD	0,17	0,16	
262	Plafond	Plafond Casquette	Béton	Peinture	HD	0,13	0,15	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
263	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	2,11	0,13	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
264	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,18	
269	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,14	
270	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,15	0,15	
271	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,12	0,13	
265	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,36	0,17	
266	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,18	
267	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,19	
268	E	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,18	
272	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,15	0,16	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
273	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,13	0,15	
274	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,13	0,14	
275	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,16	0,15	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 2 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
276	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,17	
280	A	Porte Armoire n°1 Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,14	
277	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,17	
278	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,12	0,18	
279	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,17	
281	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,15	0,19	
282	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,13	0,13	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 3 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
283	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,16	
287	A	Porte Armoire n°2 Bâti	Bois	Peinture	HD	0,14	0,18	
284	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,15	
285	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,16	0,18	
286	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,17	
288	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,1	0,14	
289	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,15	0,15	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 4 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
290	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,19	0,17	
294	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,13	
295	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,12	
291	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,17	
296	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,14	
297	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,16	0,13	
298	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,22	0,15	
299	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,15	0,14	
300	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,18	0,14	
292	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,13	
293	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,14	0,15	
301	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,17	0,17	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
302	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,27	0,12	
303	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,18	0,11	
304	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,34	0,11	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 5 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
305	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,12	0,17	
309	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,16	
310	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,19	
306	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,18	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
311	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,37	0,17	
312	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,17	0,16	
313	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,38	0,15	
314	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,14	0,18	
315	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,18	0,17	
307	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,16	
308	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,33	0,17	
316	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,17	0,16	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
317	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,12	0,15	
318	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,18	0,14	
319	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,21	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 6 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
320	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,18	
324	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,16	
325	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,34	0,14	
321	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,19	
322	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,18	
326	D	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,12	0,16	
327	D	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,28	0,13	
328	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,35	0,12	
329	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,16	0,15	
330	D	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,16	0,16	
323	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,17	
331	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,14	0,14	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
332	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,12	0,15	
333	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,17	0,13	
334	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,13	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 7 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
335	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,18	
339	A	Porte Armoire Bâti	Bois	Peinture	HD	0,22	0,13	
336	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,14	
337	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,15	
338	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,33	0,13	
340	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,29	0,14	
341	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,18	0,16	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 8 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
342	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,38	0,17	
343	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,16	
344	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,15	
345	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,14	
346	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,14	0,12	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
347	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,16	0,15	
348	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,18	0,14	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 9 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
349	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,14	
353	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,13	0,13	
354	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,32	0,15	
350	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,14	
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
355	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,12	0,15	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
356	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,37	0,12	
351	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,13	
352	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,11	
357	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,12	0,12	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	Toutes zones	Faïence	Faïence	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
360	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,38	0,16	
361	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,12	0,15	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 10 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
362	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,14	
366	A	Porte WC Bâti	Bois	Peinture	HD	0,18	0,13	
367	A	Porte WC Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,11	0,15	
363	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,14	
371	B	Trappe GT	Bois	Peinture	HD	0,37	0,14	
364	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,21	0,13	
365	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,15	
368	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,17	0,17	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
370	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,14	0,14	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 11 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
372	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,19	0,15	
376	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,38	0,14	
377	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,39	0,13	
373	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,14	
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
378	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,13	0,13	
379	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,19	0,15	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
380	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,16	0,14	
374	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,13	
/	C	Porte-Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
381	C	Porte-Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,12	0,15	
/	C	Porte-Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
375	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,12	
382	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,33	0,13	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
383	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,13	0,15	
384	Toutes zones	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0,16	0,17	
386	Toutes zones	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0,16	0,18	
385	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,18	0,19	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

Local 12 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
387	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,12	0,14	
391	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,24	0,13	
392	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,12	0,15	
388	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,14	
393	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,33	0,14	
394	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,17	0,13	
395	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,18	0,15	
396	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,27	0,17	
397	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,16	0,14	
389	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,13	
390	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,19	0,15	
398	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,2	0,14	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
400	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,16	0,15	
401	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,14	0,14	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

Local 13 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
402	A	Façades	Enduit projeté	Peinture	HD	0,18	0,12	
403	Plafond	Plafond Casquette	Béton	Peinture	HD	0,16	0,13	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
404	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	2,31	0,15	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 30 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
/	A	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
415	A	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,37	0,13	
/	A	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
416	A	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,19	0,14	
405	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,15	
406	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,16	0,13	
413	B	Porte Armoire électrique n°1 Bâti	Bois	Vernis	HD	0,18	0,14	
414	B	Porte Armoire électrique n°1 Ouvrant	Bois	Vernis	HD	0,14	0,12	
409	C	Gaine technique 1 - Trappe Bâti	Bois	Peinture	HD	0,18	0,13	
412	C	Gaine technique 1 - Trappe Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,19	0,13	
411	C	Gaine technique 2 - Trappe Bâti	Bois	Peinture	HD	0,14	0,12	
410	C	Gaine technique 2 - Trappe Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,11	
407	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,17	
408	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,19	0,18	
417	D	Porte Armoire électrique n°2 Bâti	Bois	Vernis	HD	0,16	0,12	
418	D	Porte Armoire électrique n°2 Ouvrant	Bois	Vernis	HD	0,13	0,13	
419	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	HD	0,18	0,18	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Cage d'escalier Contre-marches	Marbre	Non peint				Non peint
420	Toutes zones	Cage d'escalier Garde-corps	Métal	Peinture	HD	0,88	0,15	
421	Toutes zones	Cage d'escalier Limon	Ciment	Peinture	HD	0,27	0,12	
422	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Droite	Métal	Peinture	HD	1,54	0,13	
423	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Gauche	Métal	Peinture	HD	1,68	0,14	
/	Toutes zones	Cage d'escalier Marches	Marbre	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	Toutes zones	Cage d'escalier Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
424	Toutes zones	Cage d'escalier Sous-face d'escalier	Ciment	Peinture	HD	0,18	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 17 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
425	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,14	
430	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,18	0,13	
431	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,18	0,15	
432	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,19	0,14	
426	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,14	0,14	
427	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,13	
428	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,37	0,15	
429	E	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,12	0,17	
433	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,13	0,14	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
434	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,3	0,17	
435	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,15	0,18	
436	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,27	0,16	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 18 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
437	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,18	
441	A	Porte Armoire n°1 Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,13	
438	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,12	
439	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,3	0,13	
440	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,14	
442	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,19	0,14	
443	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,19	0,13	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 19 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
444	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,14	
448	A	Porte Armoire n°2 Bâti	Bois	Peinture	HD	0,14	0,13	
445	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,15	
446	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,34	0,13	
447	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,13	
449	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,19	0,12	
450	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,34	0,15	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 20 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
451	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,37	0,14	
455	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,13	
456	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,15	
452	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,14	
457	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,18	0,14	
458	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,18	0,13	
459	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,24	0,15	
460	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,17	
461	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,22	0,14	
453	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,13	
454	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,15	
462	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,13	0,14	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
463	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,2	0,18	
464	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,17	0,17	
465	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,17	0,16	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 21 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
466	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,19	0,14	
470	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,13	
471	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,13	0,15	
467	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,14	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
472	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,18	
473	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,16	0,17	
474	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,14	0,17	
475	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,14	0,17	
476	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,13	0,19	
468	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,18	
469	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,18	
477	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,19	0,17	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
478	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,18	0,16	
479	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,28	0,15	
480	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,12	0,14	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 22 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
481	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,19	
485	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,18	
486	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,18	0,18	
482	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,17	
487	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,22	0,16	
488	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,31	0,18	
489	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,16	
490	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,14	
491	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,34	0,15	
483	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,38	0,14	
484	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,13	
492	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,15	0,16	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
493	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,34	0,14	
494	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,38	0,17	
495	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,12	0,16	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 23 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
496	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,24	0,17	
500	A	Porte Armoire Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,16	
497	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,18	
498	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,17	
499	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,16	
501	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,29	0,17	
502	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,14	0,14	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 24 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
503	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,17	
504	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,29	0,16	
505	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,18	
506	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,17	
507	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,18	0,15	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
508	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,12	0,17	
509	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,19	0,16	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 25 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
510	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,14	
514	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,13	
515	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,28	0,15	
511	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,14	
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
516	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,14	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
517	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,2	0,16	
512	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,17	
513	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,16	
518	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,15	0,17	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	Toutes zones	Faïence	Faïence	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
521	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,18	0,14	
522	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,17	0,15	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 26 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
523	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,17	
527	A	Porte WC Bâti	Bois	Peinture	HD	0,14	0,14	
528	A	Porte WC Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,18	0,13	
524	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,15	
525	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,14	0,14	
526	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,18	
529	D	Trappe GT	Bois	Peinture	HD	0,31	0,14	
530	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,13	0,13	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
532	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,17	0,11	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 27 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
533	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,38	0,17	
537	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,18	0,18	
538	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,18	0,16	
534	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,17	
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
539	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,24	0,16	
540	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,17	0,15	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
541	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,11	0,17	
535	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,18	
/	C	Porte-Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
542	C	Porte-Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,17	0,19	
/	C	Porte-Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
536	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,18	
543	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,18	0,17	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
544	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,19	0,14	
545	Toutes zones	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0,11	0,15	
546	Toutes zones	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0,26	0,16	
547	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,18	0,18	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 28 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
548	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,17	
552	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,14	
553	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,18	0,13	
549	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,1	0,15	
554	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,14	
555	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,18	0,12	
556	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,14	
557	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,13	
558	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,19	0,15	
550	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,14	
551	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,19	
559	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,16	0,14	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
561	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,19	0,16	
562	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,12	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 29 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
563	A	Façades	Enduit projeté	Peinture	HD	0,21	0,15	
564	Plafond	Plafond Casquette	Béton	Peinture	HD	0,19	0,14	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
565	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	2,18	0,14	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 1 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
566	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,18	0,17	
571	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,13	0,14	
572	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,12	0,13	
573	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,11	0,15	
567	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,11	0,14	
568	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,17	
569	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,14	
570	E	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,16	0,13	
574	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,18	0,15	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
575	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,11	0,18	
576	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,17	0,17	
577	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,18	0,19	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 2 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
578	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,16	
582	A	Porte Armoire n°1 Bâti	Bois	Peinture	HD	0,18	0,16	
579	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,38	0,18	
580	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,17	
581	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,16	
583	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,17	0,16	
584	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,17	0,15	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 3 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
585	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,17	
589	A	Porte Armoire n°2 Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,14	
586	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,13	
587	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,16	0,15	
588	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,14	
590	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,14	0,17	
591	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,17	0,14	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 4 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
592	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,19	0,17	
596	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,19	0,14	
597	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,19	0,13	
593	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,22	0,15	
594	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,14	
598	D	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,14	
599	D	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,19	0,14	
600	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,12	0,13	
601	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,19	0,15	
602	D	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,13	0,14	
595	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,19	
603	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,14	0,14	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
604	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,17	0,17	
605	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,15	0,12	
606	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,14	0,13	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 5 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
607	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,18	
611	A	Porte Armoire Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,19	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
608	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,18	
609	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,18	
610	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,17	
612	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,13	0,19	
613	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,14	0,16	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 6 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
614	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,12	0,18	
618	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,27	0,19	
619	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,17	
615	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,37	0,18	
620	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,16	
621	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,31	0,15	
622	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,12	0,16	
623	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,33	0,14	
624	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,17	0,16	
616	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,17	
617	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,18	
625	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,18	0,14	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
626	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,14	0,15	
627	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,3	0,14	
628	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,15	0,12	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 7 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
629	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,18	0,17	
633	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,19	0,18	
634	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,35	0,16	
630	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,17	
635	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,19	
636	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,19	0,15	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
637	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,16	
638	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,12	0,15	
639	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,35	0,17	
631	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,16	
632	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,15	
640	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,17	0,18	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
641	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,12	0,14	
642	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,17	0,15	
643	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,15	0,16	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 8 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
644	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,17	
648	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,18	
649	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,25	0,19	
645	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,18	
646	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,17	
650	D	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,17	
651	D	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,19	0,15	
652	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,17	0,14	
653	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,18	0,15	
654	D	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,12	0,14	
647	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,18	
655	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,17	0,19	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
656	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,16	0,13	
657	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,23	0,14	
658	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,17	0,12	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 9 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
659	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,19	
663	A	Porte Armoire Bâti	Bois	Peinture	HD	0,19	0,18	
660	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,21	0,17	
661	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,19	
662	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,18	
664	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,12	0,19	
665	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,19	0,15	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 10 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
666	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,17	
670	A	Porte Débarras Bâti	Bois	Peinture	HD	0,37	0,18	
673	A	Porte Débarras Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,18	0,17	
667	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,16	
668	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,19	
669	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,18	
671	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,18	0,18	
672	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,16	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 11 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
674	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,16	
675	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,17	
676	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,15	
677	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,16	
678	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,15	0,14	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
679	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,17	
680	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,15	0,16	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 12 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
681	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,15	
685	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,16	
686	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,14	
682	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,12	
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
687	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,15	0,18	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
688	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,15	0,19	
683	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,17	
684	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,24	0,18	
689	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,13	0,19	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Faïence	Faïence	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
692	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,15	0,15	
693	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,14	0,14	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 13 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
694	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,15	
698	A	Porte WC Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,16	
699	A	Porte WC Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,14	0,14	
695	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,12	
700	B	Trappe GT	Bois	Peinture	HD	0,13	0,12	
696	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,18	0,12	
697	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,16	
701	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,18	0,13	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
703	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,15	0,18	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 14 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
704	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,18	0,16	
708	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,18	0,17	
709	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,19	0,17	
705	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,18	
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
710	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,13	0,19	
711	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,18	0,18	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
712	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,14	0,17	
706	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,37	0,18	
/	C	Porte-Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
713	C	Porte-Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,17	0,19	
/	C	Porte-Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
707	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,15	
714	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,12	0,16	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
715	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,2	0,17	
716	Toutes zones	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0,18	0,13	
717	Toutes zones	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0,1	0,14	
718	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,17	0,13	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 15 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
719	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,18	0,15	
723	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,16	
724	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,14	
720	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,12	
725	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,13	0,12	
726	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,38	0,12	
727	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,31	0,16	
728	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,13	
729	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,13	0,15	
721	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,16	
722	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,14	
730	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,14	0,12	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
732	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,24	0,16	
733	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,16	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 16 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
734	A	Façades	Enduit projeté	Peinture	HD	0,15	0,18	
735	Plafond	Plafond Casquette	Béton	Peinture	HD	0,16	0,17	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
736	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	1,45	0,14	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 30 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
737	A	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,17	0,14	
/	A	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
738	A	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,13	0,15	
739	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,14	0,16	
740	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,37	0,15	
743	B	Porte Armoire électrique n°1 Bâti	Bois	Vernis	HD	0,15	0,15	
744	B	Porte Armoire électrique n°1 Ouvrant	Bois	Vernis	HD	0,15	0,14	
745	C	Gaine technique 1 - Trappe Bâti	Bois	Peinture	HD	0,14	0,15	
746	C	Gaine technique 1 - Trappe Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,12	0,16	
747	C	Gaine technique 2 - Trappe Bâti	Bois	Peinture	HD	0,12	0,17	
748	C	Gaine technique 2 - Trappe Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,16	
741	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,18	
742	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,2	0,17	
749	D	Porte Armoire électrique n°2 Bâti	Bois	Vernis	HD	0,24	0,19	
750	D	Porte Armoire électrique n°2 Ouvrant	Bois	Vernis	HD	0,11	0,18	
751	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,16	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Cage d'escalier Contre-marches	Marbre	Non peint				Non peint
752	Toutes zones	Cage d'escalier Garde-corps	Métal	Peinture	HD	0,18	0,16	
753	Toutes zones	Cage d'escalier Limon	Ciment	Peinture	HD	0,19	0,17	
754	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Droite	Métal	Peinture	HD	0,15	0,16	
755	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Gauche	Métal	Peinture	HD	0,13	0,18	
/	Toutes zones	Cage d'escalier Marches	Marbre	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Cage d'escalier Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
756	Toutes zones	Cage d'escalier Sous-face d'escalier	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,19	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 17 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
757	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,12	0,15	
762	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,16	
763	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,19	0,14	
764	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,14	0,12	
758	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,12	
759	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,38	0,12	
760	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,16	
761	E	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,13	
765	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,14	0,15	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
766	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,17	0,17	
767	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,17	0,16	
768	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,14	0,18	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 18 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
769	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,24	0,17	
773	A	Porte Armoire n°1 Bâti	Bois	Peinture	HD	0,14	0,16	
770	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,18	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
771	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,12	0,15	
772	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,16	
774	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,15	0,14	
775	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,24	0,12	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 19 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
776	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,15	
780	A	Porte Armoire n°2 Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,16	
777	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,24	0,14	
778	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,27	0,12	
779	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,12	
781	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,19	0,12	
782	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,14	0,16	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 20 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
783	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,18	
787	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,17	
788	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,14	0,19	
784	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,18	
789	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,17	
790	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,19	0,18	
791	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,16	0,17	
792	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,13	0,18	
793	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,17	0,17	
785	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,16	
786	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,15	
794	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,19	0,17	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
795	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,16	0,16	
796	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,16	0,18	
797	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,1	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 21 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
798	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,24	0,18	
802	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,18	0,17	
803	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,16	0,19	
799	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,2	0,18	
804	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,14	0,17	
805	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,16	0,18	
806	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,17	
807	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,13	0,18	
808	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,13	0,17	
800	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,16	
801	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,33	0,15	
809	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,14	0,17	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
810	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,14	0,16	
811	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,14	0,15	
812	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,17	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 22 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
813	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,16	0,18	
817	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,19	0,17	
818	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,12	0,19	
814	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,18	
819	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,17	
820	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,19	0,18	
821	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,24	0,17	
822	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,36	0,18	
823	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,17	0,17	
815	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,16	
816	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,21	0,15	
824	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,25	0,17	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
825	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,18	0,13	
826	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,18	0,12	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
827	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,13	0,15	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 23 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
828	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,18	
832	A	Porte Armoire Bâti	Bois	Peinture	HD	0,09	0,17	
829	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,19	
830	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,18	
831	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,17	
833	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,17	0,18	
834	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,14	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 24 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
835	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,18	
836	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,33	0,17	
837	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,19	
838	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,18	
839	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,14	0,17	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
840	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,16	0,16	
841	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,27	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 25 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
842	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,18	
846	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,19	
847	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,16	0,19	
843	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,12	0,19	
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
848	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,14	0,16	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
849	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,16	0,17	
844	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,24	0,15	
845	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,14	
850	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,15	0,15	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Faïence	Faïence	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
853	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,14	0,16	
854	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,24	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 26 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
855	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,26	0,17	
859	A	Porte WC Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,18	
860	A	Porte WC Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,16	
856	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,18	
857	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,1	0,19	
858	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,16	
861	D	Trappe GT	Bois	Peinture	HD	0,16	0,17	
862	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,14	0,18	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
864	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,16	0,15	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 27 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
865	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,14	0,17	
869	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,14	0,16	
870	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,22	0,15	
866	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,18	
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
871	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,12	0,17	
872	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,16	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
873	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,37	0,18	
867	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,17	
/	C	Porte-Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
874	C	Porte-Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,19	0,16	
/	C	Porte-Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
868	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,15	
875	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,17	0,14	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
876	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,18	0,17	
877	Toutes zones	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0,33	0,18	
878	Toutes zones	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0,16	0,16	
879	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,15	0,15	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 28 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
880	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,21	0,18	
884	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,37	0,15	
885	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,16	0,16	
881	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,25	0,18	
886	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,38	0,15	
887	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,14	0,14	
888	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,18	0,14	
889	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,13	0,15	
890	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,14	0,14	
882	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,19	
883	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,19	
891	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,32	0,18	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
893	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,19	0,13	
894	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,34	0,14	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 29 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
895	A	Façades	Enduit projeté	Peinture	HD	0,12	0,15	
896	Plafond	Plafond Casquette	Béton	Peinture	HD	0,22	0,14	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
897	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	2,02	0,13	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 1 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
898	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,16	0,18	
903	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,15	
904	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,14	0,16	
905	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,15	0,18	
899	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,19	0,15	
900	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,14	
901	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,14	
902	E	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,15	
906	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,33	0,14	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
907	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,12	0,16	
908	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,13	0,17	
909	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,14	0,18	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 2 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
910	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,18	
914	A	Porte Armoire n°1 Bâti	Bois	Peinture	HD	0,18	0,15	
911	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,3	0,16	
912	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,16	0,18	
913	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,15	
915	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,14	0,14	
916	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,15	0,14	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 3 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
917	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,18	
921	A	Porte Armoire n°2 Bâti	Bois	Peinture	HD	0,31	0,15	
918	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,16	
919	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,34	0,18	
920	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,15	
922	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,18	0,14	
923	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,17	0,14	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 4 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
924	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,18	
928	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,14	0,15	
929	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,12	0,16	
925	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,14	0,18	
926	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,15	
930	D	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,18	0,14	
931	D	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,15	0,14	
932	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,27	0,15	
933	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,37	0,14	
934	D	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,14	0,19	
927	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,19	
935	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,15	0,18	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
936	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,15	0,15	
937	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,15	0,14	
938	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,13	0,14	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 5 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
939	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,18	
943	A	Porte Armoire Bâti	Bois	Peinture	HD	0,19	0,15	
940	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,16	
941	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,18	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
942	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,18	
944	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,14	0,17	
945	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,27	0,19	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 6 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
946	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,18	
950	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,15	
951	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,37	0,16	
947	B	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,18	0,18	
952	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,15	
953	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,14	0,14	
954	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,14	0,14	
955	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,13	0,15	
956	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,21	0,14	
948	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,19	
949	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,19	
957	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,3	0,18	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
958	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,17	0,18	
959	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,19	0,17	
960	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,17	0,19	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 7 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
961	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,24	0,18	
965	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,15	
966	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,12	0,16	
962	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,18	
967	C	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,14	0,15	
968	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,36	0,14	
969	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,12	0,14	
970	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,13	0,15	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
971	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,16	0,18	
963	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,17	
964	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,19	
972	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,12	0,15	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
973	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,14	0,16	
974	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,29	0,17	
975	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,17	0,15	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 8 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
976	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,17	
980	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,17	
981	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,19	0,18	
977	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,16	
978	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,19	
982	D	Fenêtre Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,19	
983	D	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,19	0,17	
984	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,17	
985	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,16	0,16	
986	D	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,18	0,17	
979	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,18	
987	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,16	0,16	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
988	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,16	0,15	
989	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,15	0,14	
990	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,14	0,13	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 9 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
991	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,17	
995	A	Porte Armoire Bâti	Bois	Peinture	HD	0,18	0,16	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
992	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,15	
993	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,14	
994	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,31	0,16	
996	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,14	0,17	
997	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,14	0,18	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 10 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
998	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,18	
1002	A	Porte Débarras Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,15	
1003	A	Porte Débarras Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,16	0,16	
999	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,18	
1000	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,24	0,15	
1001	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,14	
1004	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,2	0,14	
1005	Sol	Plancher dans armoires	Bois	Peinture	HD	0,14	0,15	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 11 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1006	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,18	
1007	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,33	0,19	
1008	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,36	0,18	
1009	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,19	
1010	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,19	0,19	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
1011	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,26	0,18	
1012	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,18	0,18	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 12 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
1013	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,33	0,15	
1017	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,18	0,16	
1018	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,18	0,14	
1014	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,33	0,15	
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
1019	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,18	0,15	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
1020	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,17	0,13	
1015	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,17	
1016	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,18	
1021	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,12	0,17	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Faïence	Faïence	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
1024	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,18	0,19	
1025	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,15	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 13 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
1026	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,19	
1030	A	Porte WC Bâti	Bois	Peinture	HD	0,15	0,12	
1031	A	Porte WC Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,13	
1027	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,19	
1032	B	Trappe GT	Bois	Peinture	HD	0,14	0,14	
1028	C	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,32	0,16	
1029	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,17	
1033	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,14	0,16	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
1035	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,13	0,13	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 14 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1036	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,12	0,18	
1040	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,16	0,17	
1041	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,16	0,17	
1037	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,16	
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
1042	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,13	0,16	
1043	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,36	0,15	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
1044	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,14	0,14	
1038	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,15	
/	C	Porte-Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
1045	C	Porte-Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,37	0,16	
/	C	Porte-Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
1039	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,17	
1046	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,18	0,18	
/	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Non peint				Non peint
1047	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,14	0,19	
1048	Toutes zones	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0,32	0,18	
1049	Toutes zones	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0,13	0,18	
1050	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,14	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 15 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1051	A	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,17	
1055	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,17	0,17	
1056	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,15	0,18	
1052	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,16	
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
1057	C	Fenêtre Coffre de volets roulants	Bois	Peinture	HD	0,19	0,17	
1058	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,17	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
1059	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,14	0,15	
1053	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,14	
1054	D	Mur	Ciment	Peinture	HD	0,1	0,15	
1060	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	HD	0,31	0,13	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
1062	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,18	
1063	Toutes zones	Tuyauterie	Métal	Peinture	HD	0,19	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 16 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1064	A	Façades	Enduit projeté	Peinture	HD	0,17	0,16	
1065	Plafond	Plafond Casquette	Béton	Peinture	HD	0,38	0,15	
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
1066	Toutes zones	Garde-corps	Métal	Peinture	HD	1,91	0,12	
Commentaire sur le local			Néant					

Local 1 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	B	Mur	Briques	Non peint				Non peint
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
1068	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,15	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
1069	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,17	0,15	
/	C	Mur	Briques	Non peint				Non peint
/	D	Mur	Briques	Non peint				Non peint
1067	Plafond	Plafond Charpente	Bois	Vernis	HD	0,15	0,18	
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 2 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Mur	Plâtre	Non peint				Non peint
1071	A	Porte Bâti	Bois	Peinture	HD	0,13	0,15	
1072	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,17	0,14	
/	B	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	C	Mur	Briques	Non peint				Non peint
/	D	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
1070	Plafond	Plafond Charpente	Bois	Vernis	HD	0,18	0,18	
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 3 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
/	B	Mur	Briques	Non peint				Non peint
/	C	Fenêtre Bâti	PVC	PVC				PVC
1073	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,14	0,15	
/	C	Fenêtre Ouvrant	PVC	PVC				PVC
1074	C	Fenêtre Tablette	Bois	Peinture	HD	0,16	0,14	
/	C	Mur	Briques	Non peint				Non peint
/	D	Mur	Briques	Non peint				Non peint
1075	Plafond	Plafond Charpente	Bois	Vernis	HD	0,31	0,18	
/	Sol	Revêtement de sol	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

Local 7 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Mur	BA13	Peinture				Substrat postérieur à 1949
/	B	Mur	BA13	Peinture				Substrat postérieur à 1949
1076	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,19	
/	D	Mur	BA13	Peinture				Substrat postérieur à 1949
/	Plafond	Plafond	BA13	Peinture				Substrat postérieur à 1949
/	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Non peint				Non peint
/	Toutes zones	Cage d'escalier Contre-marches	Marbre	Non peint				Non peint
1077	Toutes zones	Cage d'escalier Garde-corps	Métal	Peinture	HD	0,89	0,14	
1078	Toutes zones	Cage d'escalier Limon	Ciment	Peinture	HD	0,18	0,15	
1079	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Droite	Métal	Peinture	HD	1,52	0,12	
1080	Toutes zones	Cage d'escalier Main-courante Gauche	Métal	Peinture	HD	1,67	0,12	
/	Toutes zones	Cage d'escalier Marches	Marbre	Non peint				Non peint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	Toutes zones	Cage d'escalier Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
1081	Toutes zones	Cage d'escalier Sous-face d'escalier	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,18	
Commentaire sur le local			Néant					

Façade Avant								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1086	A	Façade Conduit DEP Dauphin n°1	Métal	Peinture	HD	1,77	0,15	
1087	A	Façade Conduit DEP Dauphin n°2	Métal	Peinture	HD	2,05	0,15	
/	A	Façade	Briques	Non peint				Non peint
1082	A	Façade	Enduit projeté	Peinture	HD	0,22	0,16	
1083	A	Façade Appui de fenêtre	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,15	
1084	A	Façade Casquette	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,16	
1085	A	Façade Soubassement	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,18	
Commentaire sur le local			Néant					

Façade Arrière								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Façade	Briques	Non peint				Non peint
1088	A	Façade	Enduit projeté	Peinture	HD	0,15	0,18	
1089	A	Façade Appui de fenêtre	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,18	
1090	A	Façade Casquette	Ciment	Peinture	HD	0,17	0,17	
1092	A	Façade Conduit DEP Dauphin n°1	Métal	Peinture	HD	2,55	0,12	
1093	A	Façade Conduit DEP Dauphin n°2	Métal	Peinture	HD	3,98	0,17	
1094	A	Façade Conduit DEP Dauphin n°3	Métal	Peinture	HD	0,32	0,15	
1091	A	Façade Soubassement	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,17	
Commentaire sur le local			Néant					

Façade Gauche								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Façade	Briques	Non peint				Non peint
1097	A	Façade	Costière de rive	Peinture	HD	0,14	0,17	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1095	A	Façade	Enduit projeté	Peinture	HD	0,33	0,18	
1096	A	Façade Appui de fenêtre	Ciment	Peinture	HD	0,14	0,18	
1098	A	Façade Soubassement	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,19	
Commentaire sur le local			Néant					

Façade Droite								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	A	Façade	Briques	Non peint				Non peint
1100	A	Façade	Costière de rive	Peinture	HD	0,13	0,19	
1099	A	Façade	Enduit projeté	Peinture	HD	0,17	0,18	
1101	A	Façade Appui de fenêtre	Ciment	Peinture	HD	0,13	0,17	
1102	A	Façade Soubassement	Ciment	Peinture	HD	0,12	0,16	
Commentaire sur le local			Néant					

Toiture								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
/	Toutes zones	Toiture Tuiles	Terre-cuite	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local			Néant					

LEGENDE

Localisation de la mesure

HG : en Haut à Gauche
MG : au Milieu à Gauche
BG : en Bas à Gauche

HC : en Haut au Centre
C : au Centre
BC : en Bas au Centre

HD : en Haut à Droite
MD : au Milieu à Droite
BD : en Bas à Droite

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Caserne AULT 66 avenue Général Leclerc 80460 AULT
N° dossier :	27073077 CASERNE AULT				
N° planche :	1/10	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Caserne d'AULT



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Caserne AULT 66 avenue Général Leclerc 80460 AULT
N° dossier :	27073077 CASERNE AULT				
N° planche :	2/10	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Caserne d'AULT - SOUS-SOL

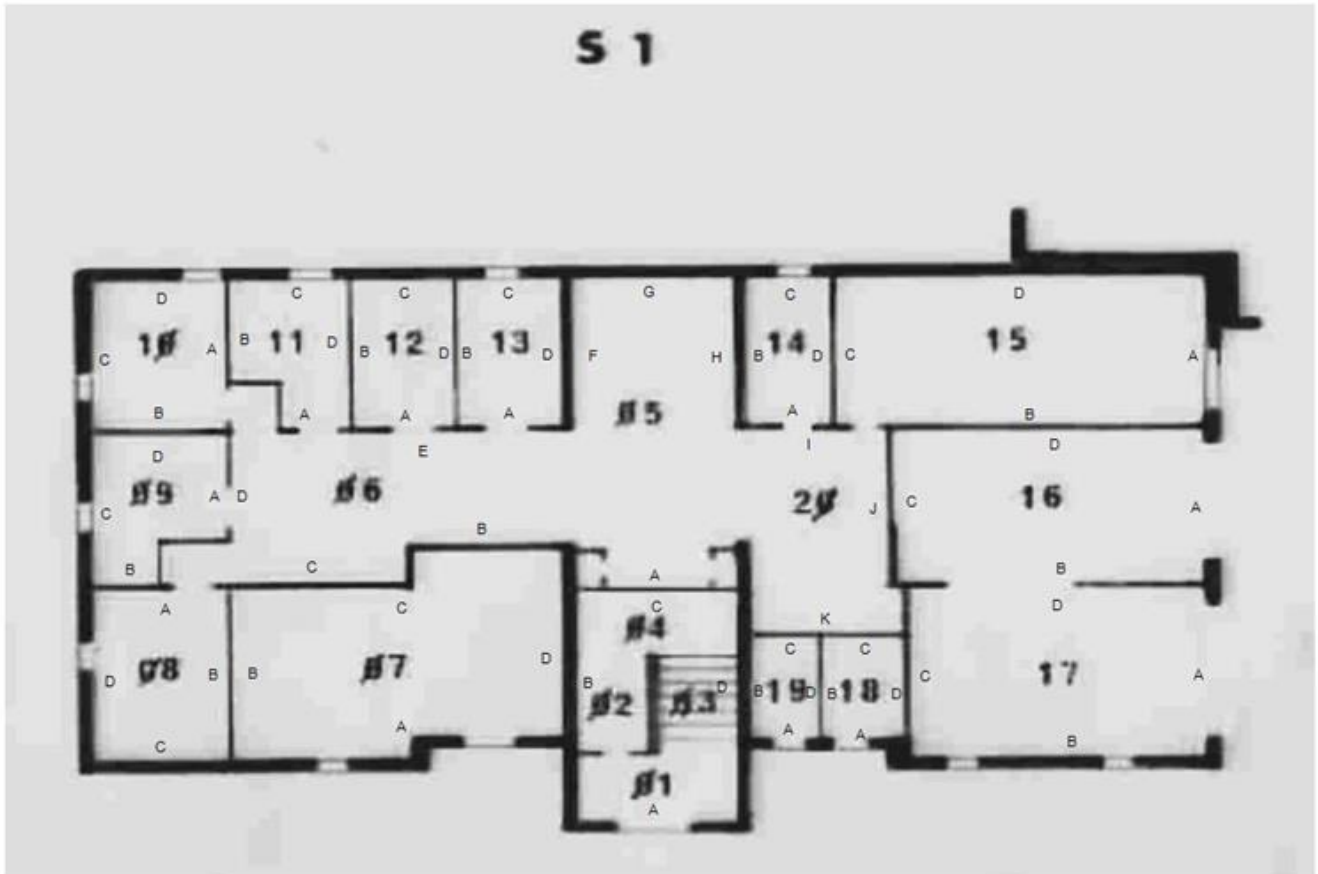


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Caserne AULT 66 avenue Général Leclerc 80460 AULT
N° dossier :	27073077 CASERNE AULT			
N° planche :	3/10	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Caserne d'AULT - REZ-DE-CHAUSSEE

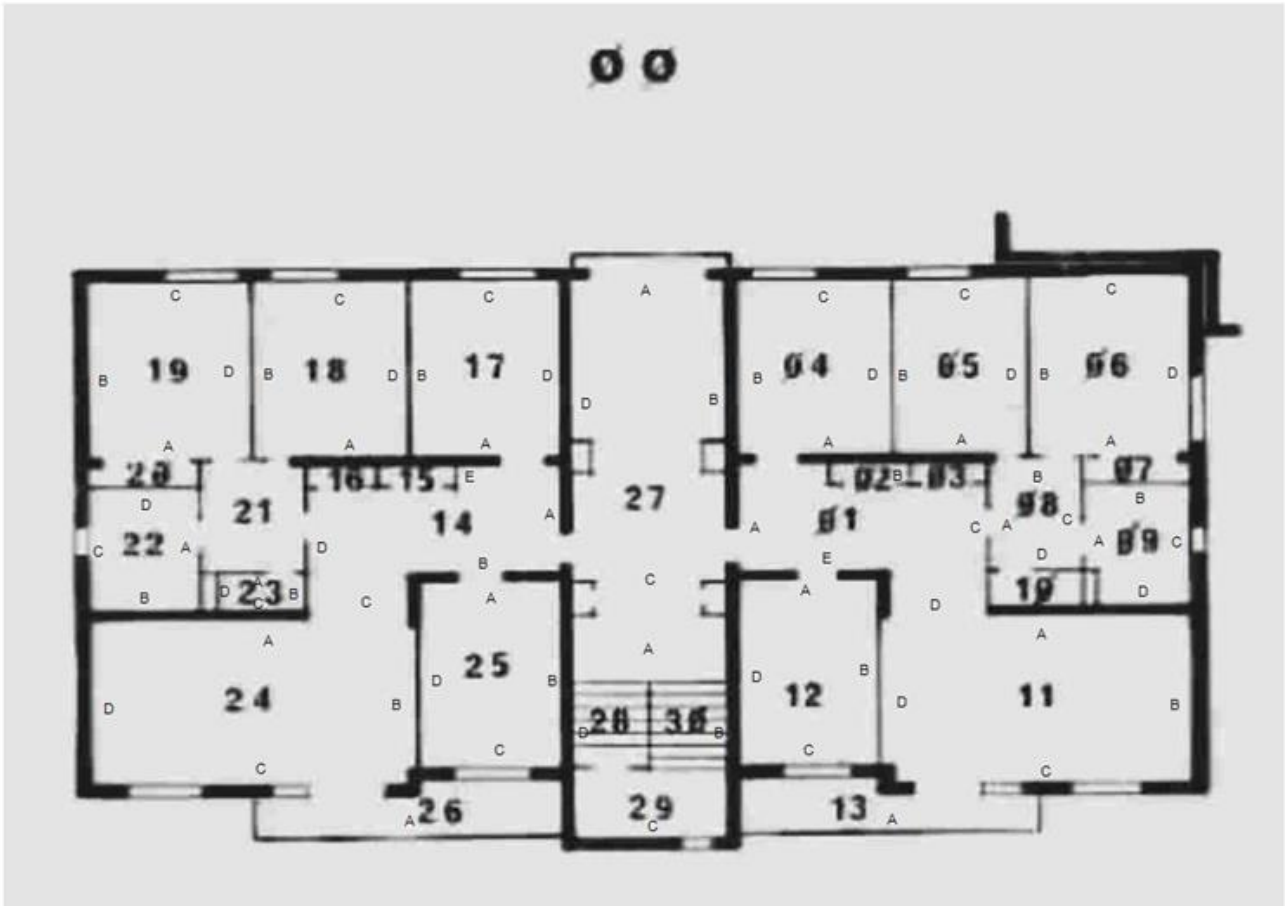


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Caserne AULT 66 avenue Général Leclerc 80460 AULT
N° dossier :	27073077 CASERNE AULT				
N° planche :	4/10	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Caserne d'AULT - R+1

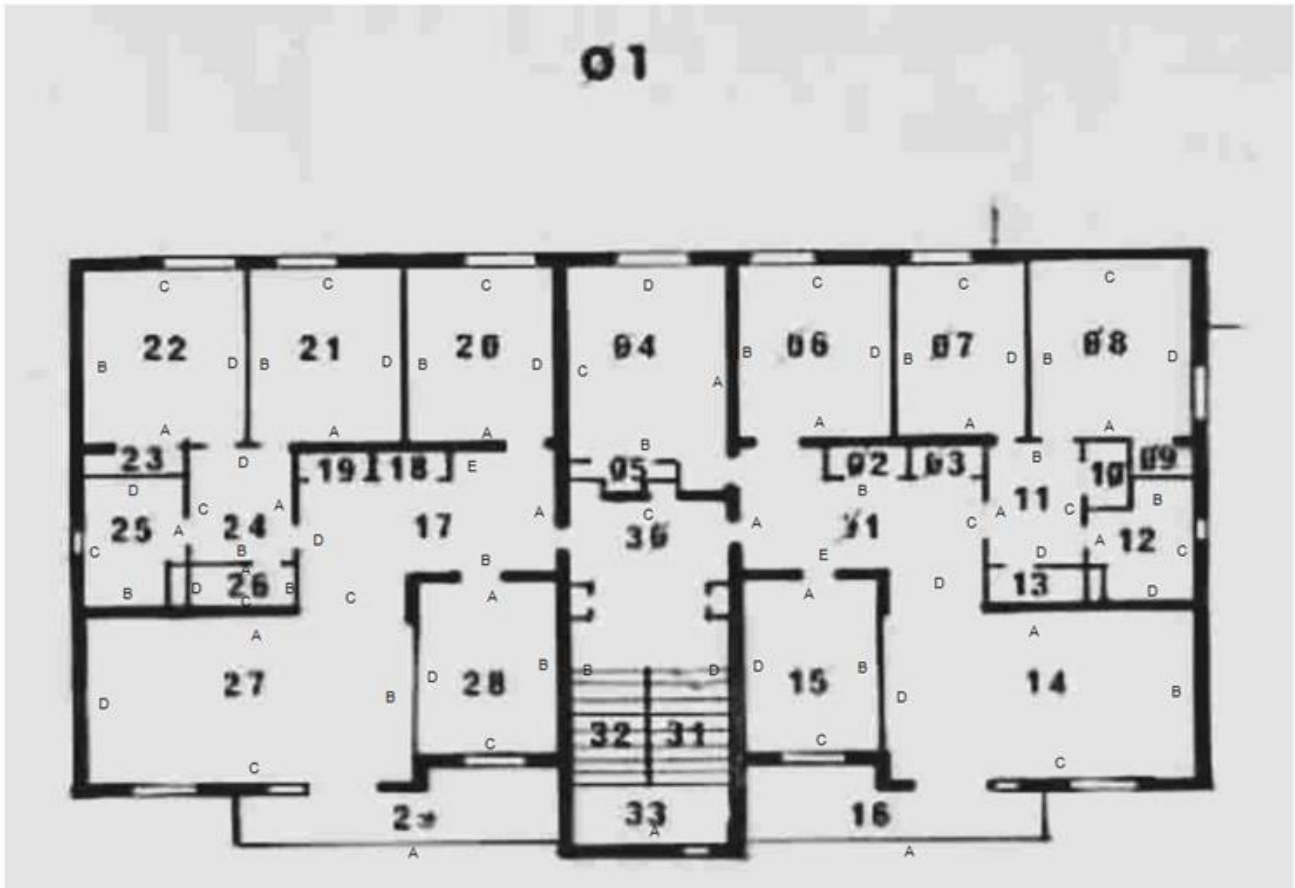


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Caserne AULT 66 avenue Général Leclerc 80460 AULT
N° dossier :	27073077 CASERNE AULT				
N° planche :	5/10	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Caserne d'AULT - R+2


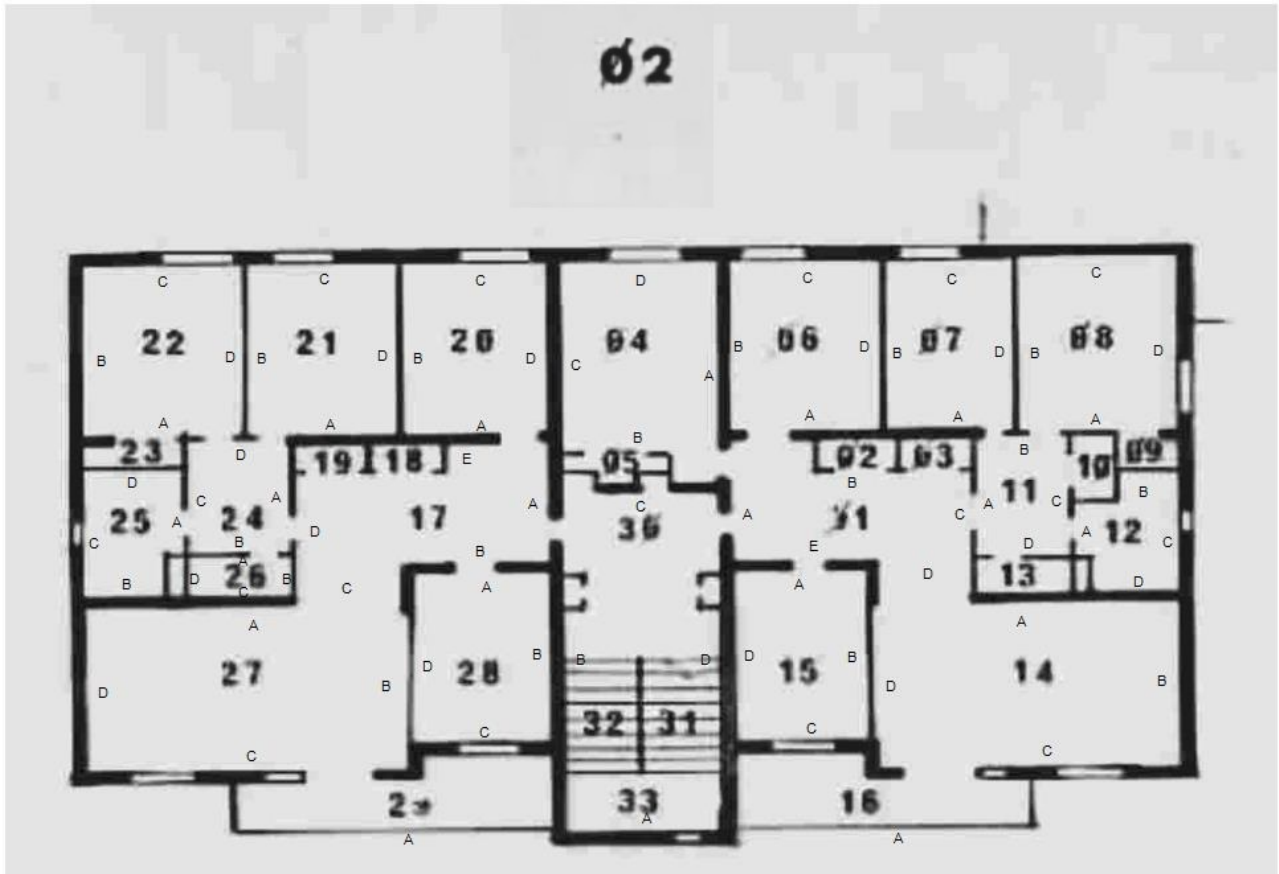


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Caserne AULT 66 avenue Général Leclerc 80460 AULT
N° dossier :	27073077 CASERNE AULT				
N° planche :	6/10	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Caserne d'AULT - R+3



ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

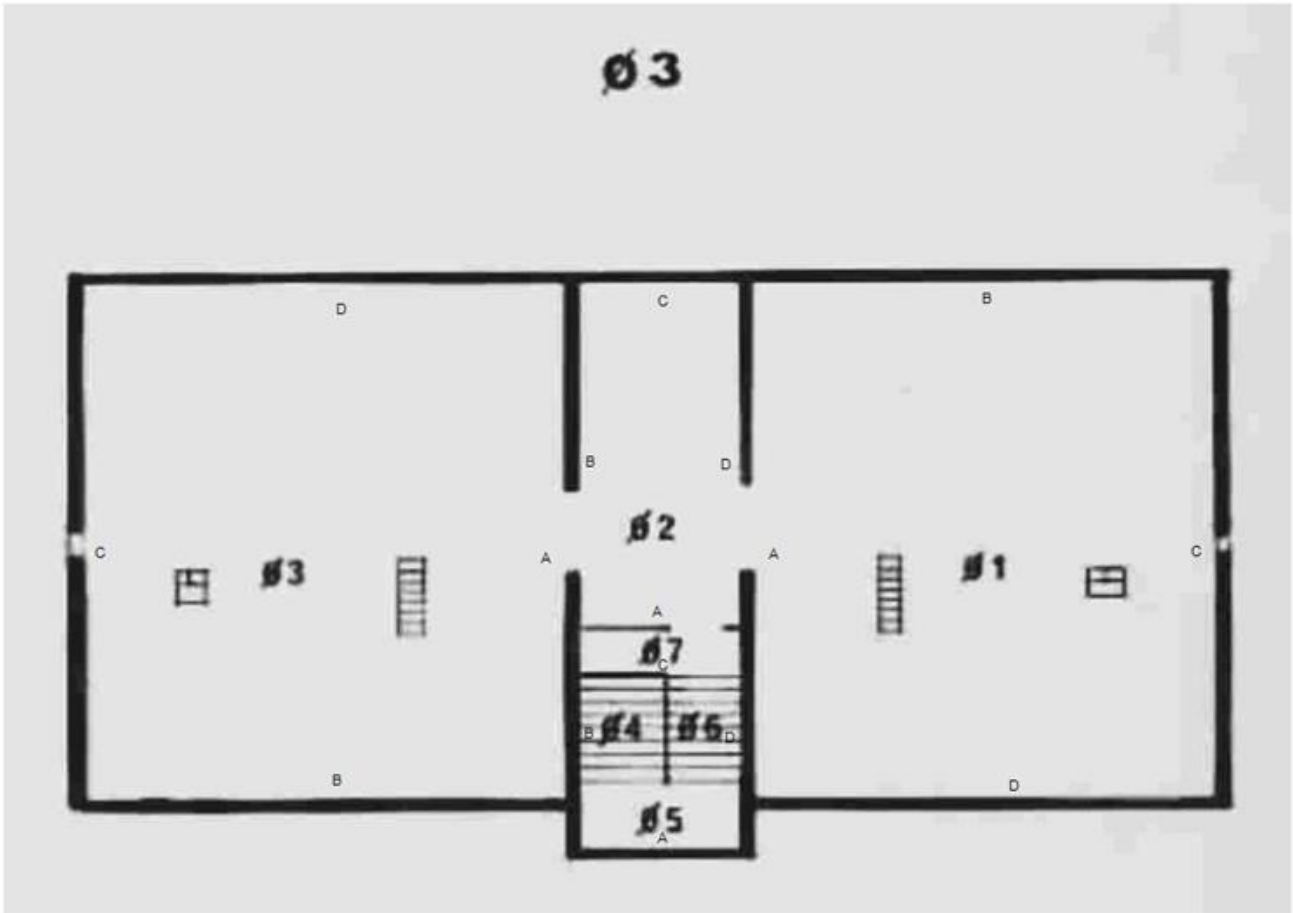

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michélet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- ☐ Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- ☐ Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- ☐ Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- ☐ Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- ☐ Etat parasitaire
- ☐ Etat relatif à la présence de termites
- ☐ Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- ☐ Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- ☐ Diagnostic radon
- ☐ Diagnostic technique global
- ☐ Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- ☐ Repérage amiante pour établissement du constat vente
- ☐ Constat des risques d'exposition au plomb
- ☐ Etat relatif à la présence de termites
- ☐ Diagnostic de performance énergétique
- ☐ Etat de l'installation intérieure d'électricité
- ☐ Etat de l'installation intérieure de gaz
- ☐ Mesurages Carrez - Boutin
- ☐ Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michélet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsplatz 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N°HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- ☐ Assistance technique amiante et plomb
- ☐ Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N°HRB 206312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhendorfer Strasse 106 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE



Groupe Physitek

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Voisins-le-Bretonneux, le 10 juillet 2025

Protocole de vérification de justesse sur les étalons à 0,31 et 0,71

Cette note traite des mesures réalisées avec un analyseur de la marque Heuresis (Viken), modèle Pb200i. Avant d'entreprendre des mesures avec un analyseur, il est important de respecter un temps d'attente suffisant pour permettre la stabilisation de son électronique. Pour le modèle Pb200i, un temps minimum de 5 minutes est requis.

Dans le cadre du diagnostic avant travaux, une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être effectuée à l'aide de deux échantillons de référence (par exemple, NIST SRM 2575 et SRM 2574). Pour la mesure, ces échantillons de référence doivent être maintenus dans un état de propreté suffisant pour éviter une contamination par le plomb et placés sur un substrat propre, sans plomb confirmé (planche de bois brut, plaque de plâtre brut, etc.). Il faut s'assurer que l'épaisseur du substrat est suffisante pour ne pas capter un interférant sous-jacent potentiel. Lors d'une mesure réalisée sur une valise de transport, il est essentiel de veiller à ce qu'aucun élément n'interfère avec la mesure.

Autre point important : comme pour toute mesure, il est nécessaire d'attendre le temps requis pour que l'incertitude indiquée par l'appareil se stabilise.

Au démarrage, après la stabilisation de l'électronique, la campagne de mesures ne pourra être entreprise que si la valeur obtenue est dans l'intervalle de la valeur de l'échantillon certifié, plus ou moins l'incertitude de l'appareil sur cet échantillon de référence.

	Substrat	Limite Basse En mg/cm ²	Limite Haute En mg/cm ²
NIST SRM 2575 0,31 ± 0.02 mg/cm ²	Valise de transport	0.216	0.398

	Substrat	Limite Basse	Limite Haute
NIST SRM 2574 0,71 ± 0.08 mg/cm ²	Valise de transport	0.540	0.888

Demeurant à votre disposition pour tout commentaire,
Sincères salutations



Arnaud CROUZAT



Fondis Electronic - 26 avenue Duguay Trouin 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex
Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30 - Fax : +33 (0)1 30 57 33 25 - physitek.fr
SAS au capital de 2 500 000 € - N°TVA FR 15 428 583 637 - RCS Versailles 428 583 637





Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Recommended usage time for Co-57 isotope source in Heuresis XRF Analysis

To Whom It May Concern,

15 March 2016

With regard to the instrument performance of Co-57 isotope source based handheld Heuresis XRF analyzers, Model Pb200i, designed for lead-in-paint applications, we state the following:

Based on the established physical half-life of Co-57 of 271.8 days and the live time characteristics of the detection system, the maximum use for a Co-57 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal-to-noise ratios. Towards the end of the life for the source the signal-to-noise ratio decreases until the electronic noise sources becomes more dominant.

At an activity below 29MBq the required analysis time increases to levels which render the instrument impractical for the application. At very low activities also other sources of error diminish the precision and accuracy of the results.

For an analyzer with a Co-57 source with an initial activity of 185 MBq this limit is reached after 24 months.

These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally.

The stated maximum usage time of 24 months (with an initial 185 MBq source) prior to the recommended resourcing is based on physical constants and laws. Past those usage periods the units become not practical to use. The maximum resourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum periods to ensure the optimum duty cycle within proper performance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Heuresis Pb200i, XRF analyzer on a sample containing 1 mg/cm² of lead, we state the following: Beyond the time limit stated above (i.e. 24 months), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an error smaller than described in our product specifications.



Ken Martin, CIH
VP, Director Compliance
Heuresis corporation
63 Chapel Street
Newton, MA 02458 USA
Mobile: +1 617-751-8286
Fax: +1 617-467-5024
kenmartin@heuresistech.com
www.heuresistech.com



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.
