

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

### A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



#### A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : CASERNE LE GALOIS DE FOGIERES - 181 Avenue  
Pierre de Coubertin 62100 CALAIS

Référence client : BATIMENT 16

Désignation : BATIMENT 16

Date de construction : Avant 1980

#### A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BARRE Thibault

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 16/07/2021

Numéro attestation : CPDI 5320

Délivré le : 06/08/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

#### A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :  
SGAMI NORD  
Cité administrative - Rue de Tournai - BP2012  
59012 LILLE CEDEX

Donneur d'ordre :  
SGAMI NORD  
Cité administrative - Rue de Tournai - BP2012  
59012 LILLE CEDEX

#### A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 28/07/2021

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 28/07/2021

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU  
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

## B - SOMMAIRE

### A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

### B - Sommaire

### C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

### D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

### E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

### F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

### G - Grille de résultats du repérage

### Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

## C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

### C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Bâtiment 16 RDC - Vol 1 (Bâtiment 16)

Façade bâtiment 16 - Vol 2 (Façade)

### C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

| Localisation / Désignation | Justification | Investigation complémentaire restant à réaliser |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Sans objet                 | Sans objet    | Sans objet                                      |

## D - ÉTUDE PRÉALABLE

### D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Remplacement de la chaudière.

### D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- Dans la cuisine.

### D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

### D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

| Ouvrage ou composant de la construction inspecté | Plan de l'immeuble | Locaux              | Localisation |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits         | Bâtiment 16 RDC    | Vol 1 (Bâtiment 16) |              |
| Façades                                          | Façade bâtiment 16 | Vol 2 (Façade)      |              |

### D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

### D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

### D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

## E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

## E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

## E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

### E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

## F - CONCLUSIONS

### F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

### F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

## G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

### 1 - Façades

### 2 - Parois verticales intérieures et enduits

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

| Plan               | Localisation   | Composant | Partie composant    | Réf action | Observation                  | Précision loc. | Ref photo                   | Ref Prél. | Descriptif                               | Résultat | Conclusion          |
|--------------------|----------------|-----------|---------------------|------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|----------|---------------------|
| Façade bâtiment 16 | Vol 2 (Façade) | Murs      | Joint de scellement | P3         | Réalisation d'un prélèvement |                | 0020H<br>00164<br>7 n°3 - 1 | P3        | Joint, Dur, Matériau dur, Indissociables | Négatif  | Négatif sur analyse |

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

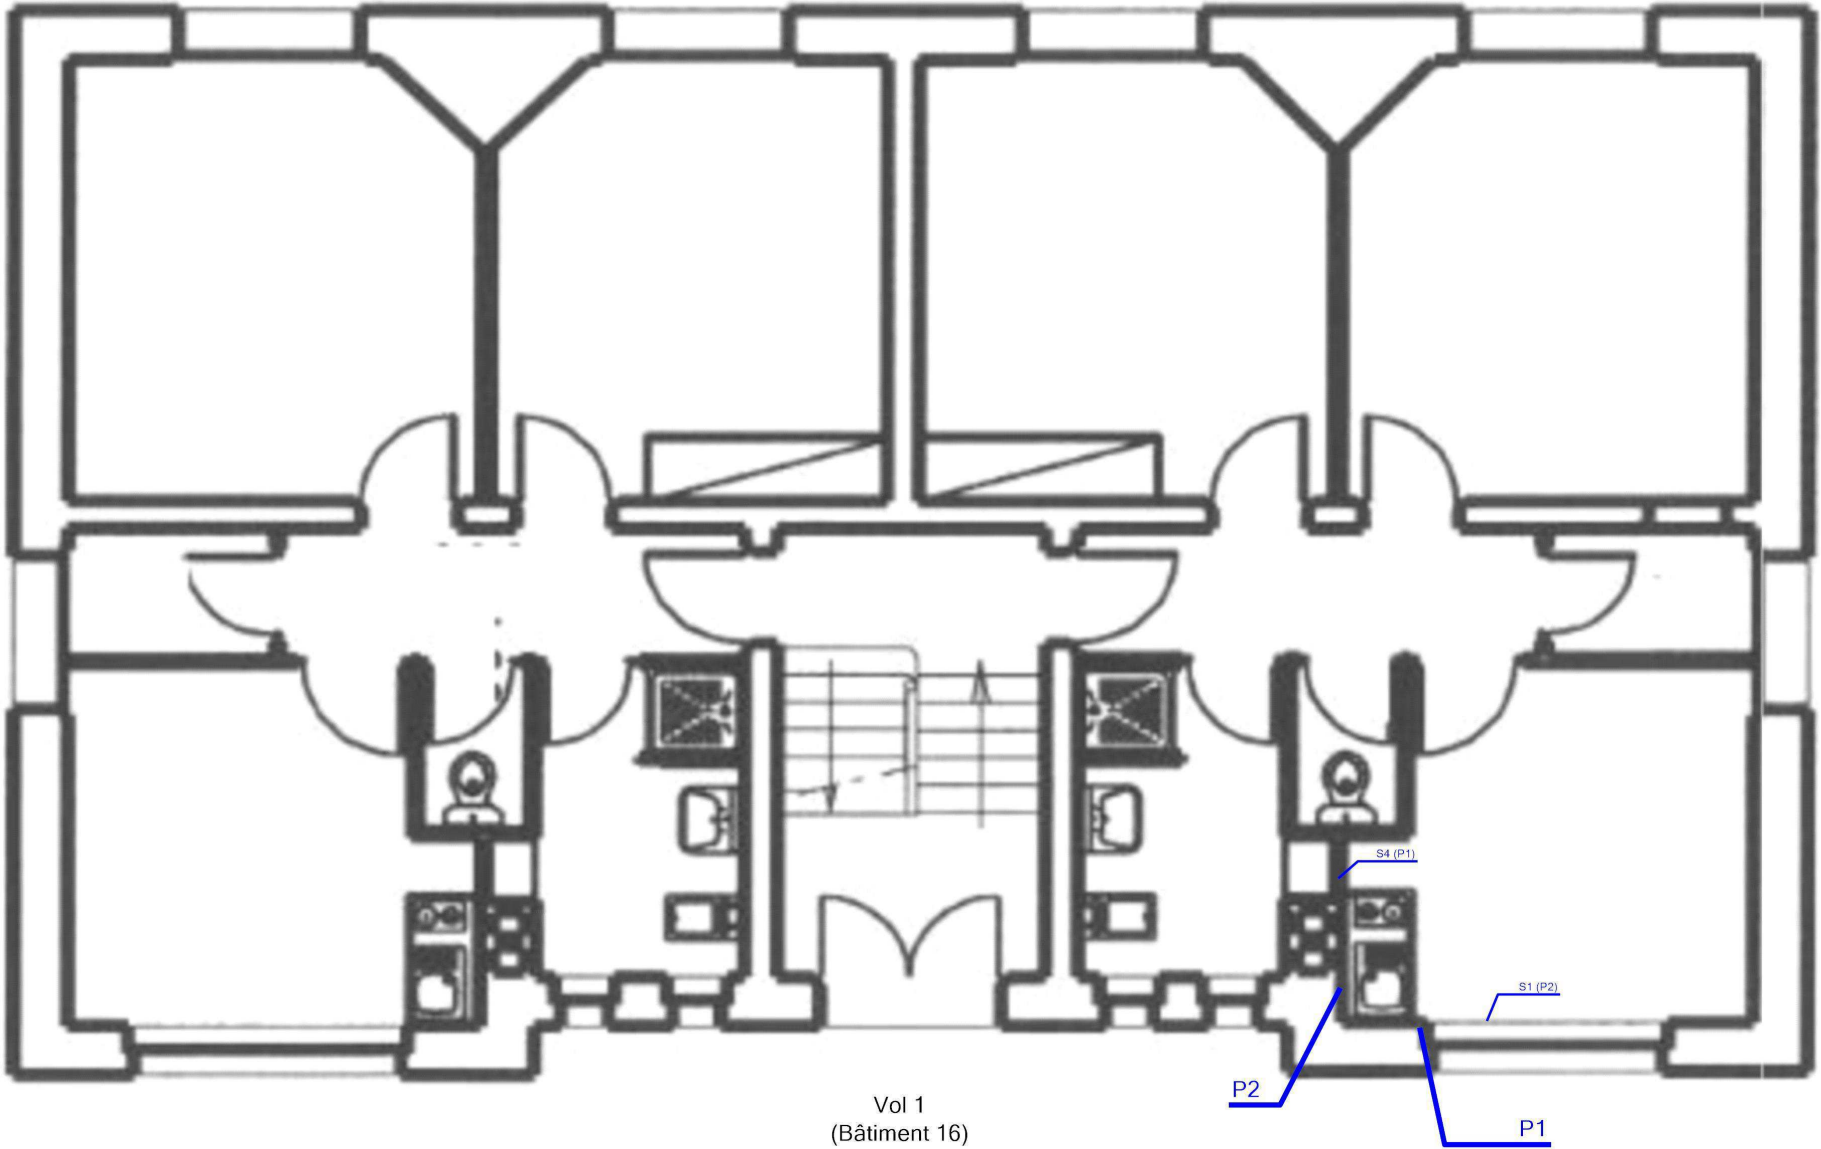
| Plan            | Localisation        | Composant        | Partie composant | Réf action | Observation                                       | Précision loc. | Ref photo                   | Ref Prél.     | Descriptif     | Résultat | Conclusion          |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|---------------------|
| Bâtiment 16 RDC | Vol 1 (Bâtiment 16) | Murs et cloisons | Enduits plâtre   | P1         | Réalisation d'un prélèvement                      |                | 0020H<br>00164<br>7 n°1 - 1 | P1            | Plâtre         | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Bâtiment 16 RDC | Vol 1 (Bâtiment 16) | Murs et cloisons | Enduits plâtre   | S4         | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1 |                | 0020H<br>00164<br>7 n°1 - 1 | P1            | Plâtre         | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Bâtiment 16 RDC | Vol 1 (Bâtiment 16) | Murs et cloisons | Enduits ciment   | P2         | Réalisation d'un prélèvement                      |                | 0020H<br>00164<br>7 n°2 - 1 | P2<br>Phase 1 | Enduits ciment | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Bâtiment 16 RDC | Vol 1 (Bâtiment 16) | Murs et cloisons | Enduits ciment   | S1         | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2 |                | 0020H<br>00164<br>7 n°2 - 1 | P2<br>Phase 1 | Enduits ciment | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Bâtiment 16 RDC | Vol 1 (Bâtiment 16) | Murs et cloisons | Enduits ciment   | P2         | Réalisation d'un prélèvement                      |                | 0020H<br>00164<br>7 n°2 - 1 | P2<br>Phase 2 | Enduits ciment | Négatif  | Négatif sur analyse |
| Bâtiment 16 RDC | Vol 1 (Bâtiment 16) | Murs et cloisons | Enduits ciment   | S1         | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2 |                | 0020H<br>00164<br>7 n°2 - 1 | P2<br>Phase 2 | Enduits ciment | Négatif  | Négatif sur analyse |

## ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

| Ref. | Plans              | Titre du plan                                          |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|      | Bâtiment 16 RDC    | Bâtiment 16 RDC - Plan de repérage - Actions menées    |
|      | Façade bâtiment 16 | Façade bâtiment 16 - Plan de repérage - Actions menées |


Légende

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Localisation dun prélèvement négatif |
|  | Localisation dun sondage négatif     |



|  | Adresse du bien                                                                 | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                     | CASERNE LE GALOIS DE FOUGIERES - 181 Avenue Pierre de Coubertin<br>62100 CALAIS | BATIMENT 16 | 16/07/2021        | BARRE Thibault         |

Légende

 P Localisation d'un prélèvement négatif



Vol 2  
(Façade)

P3

| <br>AC ENVIRONNEMENT<br><small>DIAGNOSTICS IMMOBILIERS</small> | Adresse du bien                                                                 | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                   | CASERNE LE GALOIS DE FOUGIERES - 181 Avenue Pierre de Coubertin<br>62100 CALAIS | BATIMENT 16 | 16/07/2021        | BARRE Thibault         |

## ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence                | Localisation                             | Action              |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 0020H001647 n°1 - 1 (P1) | Bâtiment 16 RDC - Vol 1<br>(Bâtiment 16) | Prélèvement négatif |
| 0020H001647 n°2 - 1 (P2) | Bâtiment 16 RDC - Vol 1<br>(Bâtiment 16) | Prélèvement négatif |
| 0020H001647 n°3 - 1 (P3) | Façade bâtiment 16 - Vol 2<br>(Façade)   | Prélèvement négatif |



0020H001647 n°1 - 1 (P1) - Bâtiment 16 RDC - Vol 1  
(Bâtiment 16)



0020H001647 n°2 - 1 (P2) - Bâtiment 16 RDC - Vol 1  
(Bâtiment 16)



0020H001647 n°3 - 1 (P3) - Façade bâtiment 16 - Vol 2  
(Façade)

## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Ref action | Categorie                                | Composant        | Materiau                                     | Localisation                          | Observation |
|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| P1         | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Plâtre - -                                   | Bâtiment 16 RDC - Vol 1 (Bâtiment 16) |             |
| P2 Phase 1 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduits ciment - -                           | Bâtiment 16 RDC - Vol 1 (Bâtiment 16) |             |
| P2 Phase 2 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduits ciment - -                           | Bâtiment 16 RDC - Vol 1 (Bâtiment 16) |             |
| P3         | Façades                                  | Murs             | Joint, Dur, Matériau dur, Indissociables - - | Façade bâtiment 16 - Vol 2 (Façade)   |             |

## RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Client :</b> AC Environnement<br>Thibault BARRE<br>Les Tertiales - 4, allée Pierre de Coubertin<br>59810 LESQUIN | <b>Référence client :</b> 0020H001647<br><b>Référence FlashLab :</b> 21FP009892<br><b>Adresse du chantier :</b> CASERNE LE GALOIS DE FOUGIERES - 181 Avenue Pierre de Coubertin 62100 CALAIS | <b>Date d'acceptation :</b> 21/07/2021<br><b>Date d'analyse :</b> 26/07/2021<br><b>Date d'édition :</b> 28/07/2021 à 11:45 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                           | Méthode | Description microscopique MOLP                                                                                                      | Préparation |                     | Résultat                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                          |         |                                                                                                                                     | Nb          | Traitement          |                             |
| <b>Référence échantillon FlashLab : 001</b><br><b>Localisation :</b> Vol 1 (Bâtiment 16) |         |                                                                                                                                     |             |                     |                             |
|                                                                                          |         | <b>Référence échantillon client :</b> 0020H001647001 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre |             |                     |                             |
| - Plâtre                                                                                 | # META  | N/A                                                                                                                                 | N/A         | Acide chlorhydrique | Absence de fibres d'amiante |
| <b>Référence échantillon FlashLab : 002</b><br><b>Localisation :</b> Vol 1 (Bâtiment 16) |         |                                                                                                                                     |             |                     |                             |
|                                                                                          |         | <b>Référence échantillon client :</b> 0020H001647002 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment |             |                     |                             |
| - Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables                                               | # META  | N/A                                                                                                                                 | N/A         | Acide chlorhydrique | Absence de fibres d'amiante |
| - Peinture, Ciment, Plâtre, Indissociables                                               | # META  | N/A                                                                                                                                 | N/A         | Chloroforme         | Absence de fibres d'amiante |
| <b>Référence échantillon FlashLab : 003</b><br><b>Localisation :</b> Vol 2 (Façade)      |         |                                                                                                                                     |             |                     |                             |
|                                                                                          |         | <b>Référence échantillon client :</b> 0020H001647003 - Façades - Murs - Joint de scellement                                         |             |                     |                             |
| - Joint, Dur, Matériau dur, Indissociables                                               | # META  | N/A                                                                                                                                 | N/A         | Acide chlorhydrique | Absence de fibres d'amiante |

### Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :

Analyse MOLP (Microscope Optique à Lumière Polarisée) selon le guide HSG 248 – Appendice 2

Analyse META (Microscope Electronique à Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de traitement

**Validé par :** MICHEL Elodie

Chef d'équipe



## ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 01/03

Assurance 02/03

Tour Opus 12 – Défense 97  
77 Esplanade du Général de Gaulle  
92014 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
T : +33 (0) 1 44 05 56 00  
F : +33 (0) 1 44 05 56 98

# HDI

## ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

**NOTRE SOUSCRIPTEUR HDI GLOBAL SE, Tour Opus 12 - La Défense 97 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92014 PARIS LA DEFENSE CEDEX** agissant au nom et pour le compte de **HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne** au capital de 121 600 000 EUR, dont le siège est à **Roderichsstraße 26, 30055 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grunheiderstraße 29, 106, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Lettre Prestation de Services, attestons que la société susdite :**

**VENTURA  
64 RUE CLEMENT ADOR  
42153 RIORDES – FRANCE**

est filiale auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE n° 76201871-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- **SYNAPPS ;**
- **AC ENVIRONNEMENT ;**
- **AC AGENCEMENT ;**
- **ALAM ENVIRONNEMENT ;**
- **ATLANTE DEVELOPPEMENT ;**
- **AC RESEAU.**


**Les activités garanties** sont les suivantes :

- **Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privées (DAPP) ;**
- **Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition ;**
- **Examen visuel après travaux de retrait d'amiante ;**
- **Recherche d'amiante dans l'air ;**
- **Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;**
- **Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;**
- **Etat du bâtiment relatif à la présence de terres ;**
- **Diagnostic légionellaire ;**
- **Etat parasitaire ;**
- **Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (CRIPPI) ;**
- **Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;**
- **Recherche de plomb avant travaux/démolition ;**
- **Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux ;**
- **Diagnostic de performance énergétique ;**
- **Diagnostic des déchets issus de la démolition/réhabilitation des bâtiments et Diagnostic « ressources » ;**
- **Carottage de voiries et réseaux routiers ;**
- **Diagnostic électrique – télétravail ;**
- **Information sur la présence d'un risque de mûre ;**
- **Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez") ;**
- **Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) ;**
- **Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété ;**
- **Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitat) ;**

**HDI Global Specialty SE**  
T +49 511 5604 2020  
F +49 511 5604 4900  
[www.hdi-specialty.com](http://www.hdi-specialty.com)

**Insurance company licensed by  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Grunheiderstraße 29, 106,  
53117 Bonn, Germany**

**Registered office: Roderichsstraße 26,  
30055 Hannover, Germany  
Commercial Register: Hamburg  
Company Number HRB 211924  
Supervisory Board: Ulrich-Walfrath/Chairman,  
Executive Board: Ralph Butler/Chairman, Andreas**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Habitation) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat de l'installation intérieure d'électricité ;</li> <li>• Etat de l'installation intérieure de gaz ;</li> <li>• Réglementation thermique ;</li> <li>• Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS) ;</li> <li>• Certificat de décence - Loi SRU ;</li> <li>• Mesure du Radon dans les bâtiments ;</li> <li>• Sécurité piscine</li> <li>• Aide administrative à la constitution de dossiers pour l'obtention de prêts à taux zéro ;</li> <li>• Relevé de côté et plan de l'existant en copropriété ;</li> <li>• Diagnostic, élaboration de plans et croquis en phase avant-projet sommaire (APS) ;</li> <li>• Qualité de l'air intérieur (ERP, milieu industriel, milieu non industriel) ;</li> <li>• Expertise automobile ;</li> <li>• Diagnostic Technique Global (DTG) ;</li> <li>• Inventaire des matières dangereuses (H/M) dans les navires ;</li> <li>• Prélèvement d'air et diagnostic en zone radioactive ;</li> <li>• BIM (plan 3D) avec hébergement des données ;</li> <li>• Pollution des sols ;</li> <li>• Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée ;</li> <li>• Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE) ;</li> <li>• Emission d'attestation CEE (Certificat d'Economie d'Energie) ;</li> <li>• Prélèvement et analyse de la teneur en plomb dans l'eau ;</li> <li>• Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments ;</li> <li>• Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositions dispositifs Robien et équivalents) ;</li> <li>• Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif ;</li> <li>• Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve ;</li> <li>• Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat ;</li> <li>• Diagnostic d'accessibilité handicapée.</li> </ul> | <p>Insurance company <b>Borsenstet</b> by<br/> <b>Bundesanstalt für<br/> Frauenstudien und Jugendhilfe,<br/> Grafenbühlstr. 29, 698,<br/> 53117 Bonn, Germany</b></p> | <p>Registered office: <b>Rodenbruchstrasse 26,<br/> 30655 Hannover, Germany</b><br/> Commercial Register <b>Hannover, Germany</b><br/> Company Number <b>HBR 211924</b><br/> Supervisory Board <b>Ulrich Wallatke/Chairman</b><br/> Executive Board <b> Ralph Seuter/Chairman, Andreas<br/> Beyersdorf, Ralf Knebel, Ralf Knebel</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Assurance 03/03

### Attestation sur l'honneur

| <div> <div>  </div> </div>           |                       |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :                                                          |                       |                                         |
| RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION                                                                                      | MONTANT DES GARANTIES |                                         |
| Tous Domages ConforDons (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)                                  | 7 500 000 EUR         | par sinistre                            |
| <b>Donc</b>                                                                                                             |                       |                                         |
| • Dommages matériels et immatériels consécutifs                                                                         | 3 000 000 EUR         | par sinistre                            |
| • Dommages immatériels non consécutifs                                                                                  | 1 000 000 EUR         | par sinistre                            |
| • Faute inexcusable de l'employeur/Malade professionnelle                                                               | 2 500 000 EUR         | par sinistre et par période d'assurance |
| • Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale) | 500 000 EUR           | par sinistre et par période d'assurance |
| • Dommages aux Biens confis                                                                                             | 30 000 EUR            | par sinistre                            |
| RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS /<br>RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE                                      |                       |                                         |
| Tous Domages ConforDons (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)                                  | 3 000 000 EUR         | par sinistre et par année d'assurance   |
| <b>Donc</b>                                                                                                             |                       |                                         |
| • Dommages matériels et immatériels consécutifs                                                                         | 3 000 000 EUR         | par sinistre et par année d'assurance   |
| • Dommages immatériels non consécutifs                                                                                  | 1 000 000 EUR         | par sinistre et par année d'assurance   |



GROUPE

AC ENVIRONNEMENT

# ATTESTATION SUR L'HONNEUR

JJe soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

JJe déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscrite d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

JJe déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

JJe déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04 Janvier 2021



Denis MORA



AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL

64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES  
☎ 07 74 44 92 44    📧 04 81 17 01 15    ✉ contact@ac-env.com  
SAS à responsabilité limitée - 1000000000 - 38877 - RCS RIORGES - TVA intracommunautaire : FR 0344355914 - ADE 71020 - Reconnue par l'INSEE le 01/04/2019 - RCS environnementale n° 76208471-30015

 0 800 400 100  
[www.ac-environnement.fr](http://www.ac-environnement.fr)

