PLANNING 06102025 (MISE EN ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS DE L'UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE)

CAZABON architecture

AFFAIRE N°599

MISE EN ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS DE L'UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE
Tel : -
Mail : muriel.marchant-catelin@ut-capitole.fr

Informations : PLANNING 06102025
Créé en date du: 27/01/2026
Edité au : 10/03/2026
Rédacteur : CAZABON ARCHITECTURE, CAZABON philippe, 05 62 73 39 83 - 06 09 71 79 89 - cazabonarchitecture@gmail.com

Dates globales	
Début	01/09/2026
Fin	08/10/2027

Coûts	
À ce jour	0,00 € HT
Total	397 188,00 € HT
Restant	397 188,00 € HT

UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE

Légende : *"J" = en jours ouvrés / "Je" = en jours écoulés)*

		Début	Fin	Durée	Prédécesseur	Av.
1	CHANTIER	01/09/2026	08/10/2027	289J		0%
2	BATIMENT CENTRAL	01/09/2026	08/10/2027	289J		0%
3	Sanitaires Tout Niveaux	05/07/2027	08/10/2027	70J		0%
4	Agrandissements portes intérieures	05/10/2026	03/11/2026	22J		0%
5	Agrandissement portes intérieures	01/02/2027	02/03/2027	22J		0%
6	Main courante cage d'escalier	01/09/2026	28/09/2026	20J		0%
7	Ouvrages signalétique	29/09/2026	05/10/2026	5J	6FD	0%
8	Accessoire PMR	06/10/2026	12/10/2026	5J	7FD	0%
9	BATIMENT AMPHITHEATRE	29/09/2026	24/09/2027	259J		0%
10	Rampe hall	05/07/2027	10/09/2027	50J		0%
11	Châssis vitrés	13/09/2027	24/09/2027	10J	10FD	0%
12	Ouvrage de signalétique	06/10/2026	12/10/2026	5J	7FD	0%
13	Main courante diverses	29/09/2026	12/10/2026	10J	6FD	0%
14	Accessoire PMR	13/10/2026	19/10/2026	5J	13FD	0%
15	BATIMENT BIBIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	20/10/2026	11/12/2026	39J		0%
16	Remplacement châssis vitrés	02/11/2026	27/11/2026	20J		0%
17	Garde corps	30/11/2026	11/12/2026	10J	16FD	0%
18	Ouvrages Signalétique	20/10/2026	26/10/2026	5J	14FD	0%
19	BATIMENT J	01/09/2026	11/12/2026	74J		0%
20	Remplacement châssis	30/11/2026	11/12/2026	10J	16FD	0%
21	Sanitaire niveau 3	01/09/2026	26/10/2026	40J		0%
22	Accessoires PMR	27/10/2026	02/11/2026	5J	18FD	0%
23	BATIMENT LAUTMANN	01/09/2026	23/09/2027	278J		0%
24	Cage d'ascenseur	02/07/2027	09/09/2027	50J		0%
25	Ascenseur	10/09/2027	23/09/2027	10J	24FD	0%
26	Sanitaires	01/09/2026	12/10/2026	30J		0%
27	Signalétique	27/10/2026	02/11/2026	5J	18FD	0%
28	BATIMENT CRA	19/10/2026	20/11/2026	25J		0%
29	Rampe	19/10/2026	20/11/2026	25J		0%
30	Signalitique	03/11/2026	09/11/2026	5J	27FD	0%
31	AMPHI CUJAS	10/11/2026	16/11/2026	5J		0%
32	Signalitique	10/11/2026	16/11/2026	5J	30FD	0%
33	BATIMENT CRI	17/11/2026	25/12/2026	29J		0%
34	Rampes	23/11/2026	25/12/2026	25J	29FD	0%
35	Signalitique	17/11/2026	23/11/2026	5J	32FD	0%
36	BATIMENT SUIO	05/01/2027	15/02/2027	30J		0%
37	Rampes	05/01/2027	15/02/2027	30J		0%
38	AGENCE COMPTABLE	24/11/2026	30/11/2026	5J		0%
39	Signalitique	24/11/2026	30/11/2026	5J	35FD	0%
40	MAISON DES ETUDIANTS	13/10/2026	29/03/2027	120J		0%

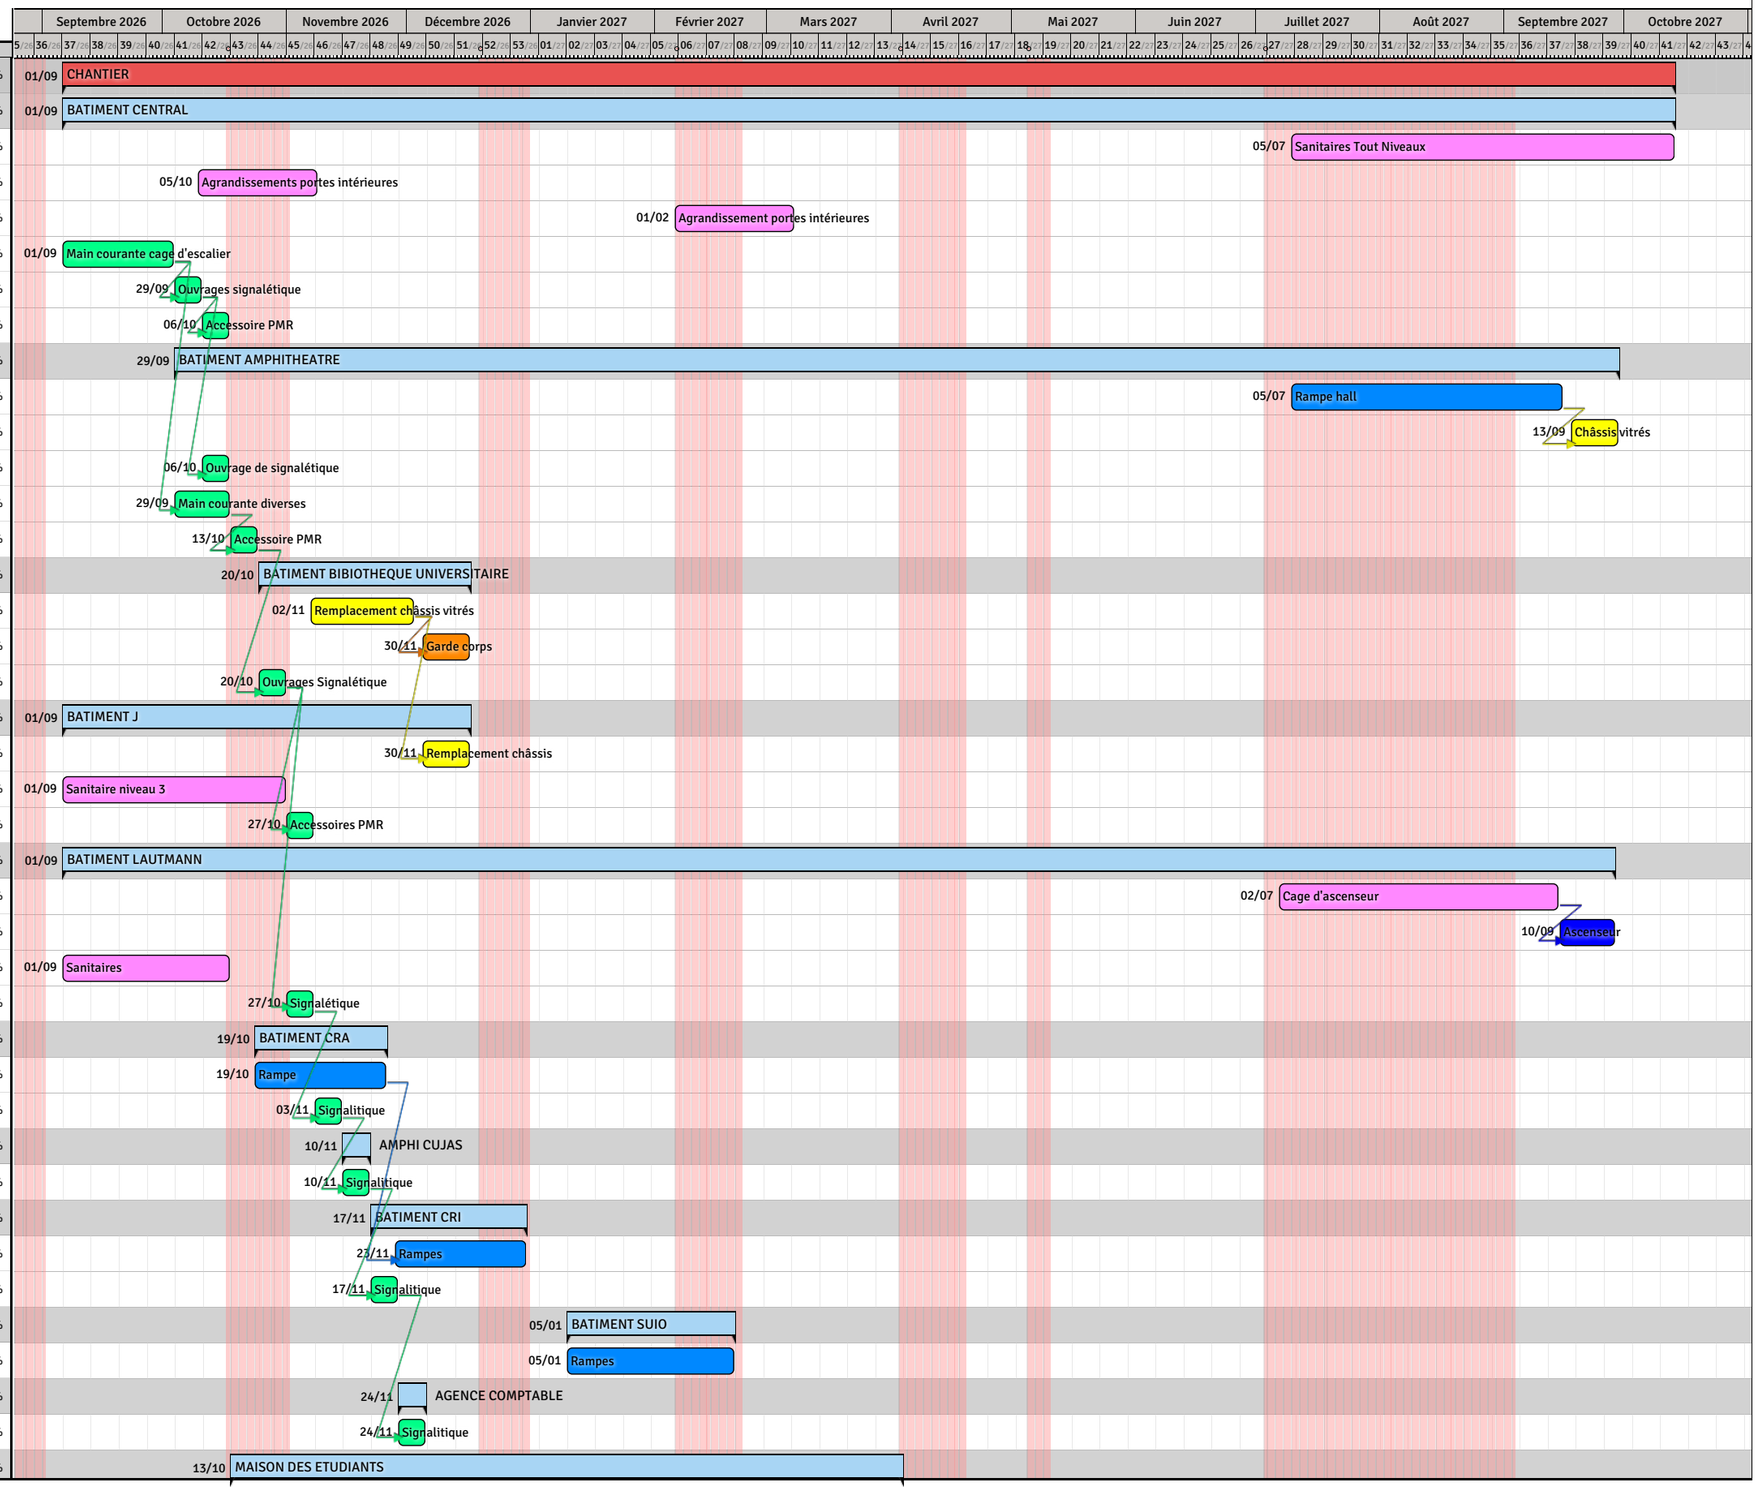
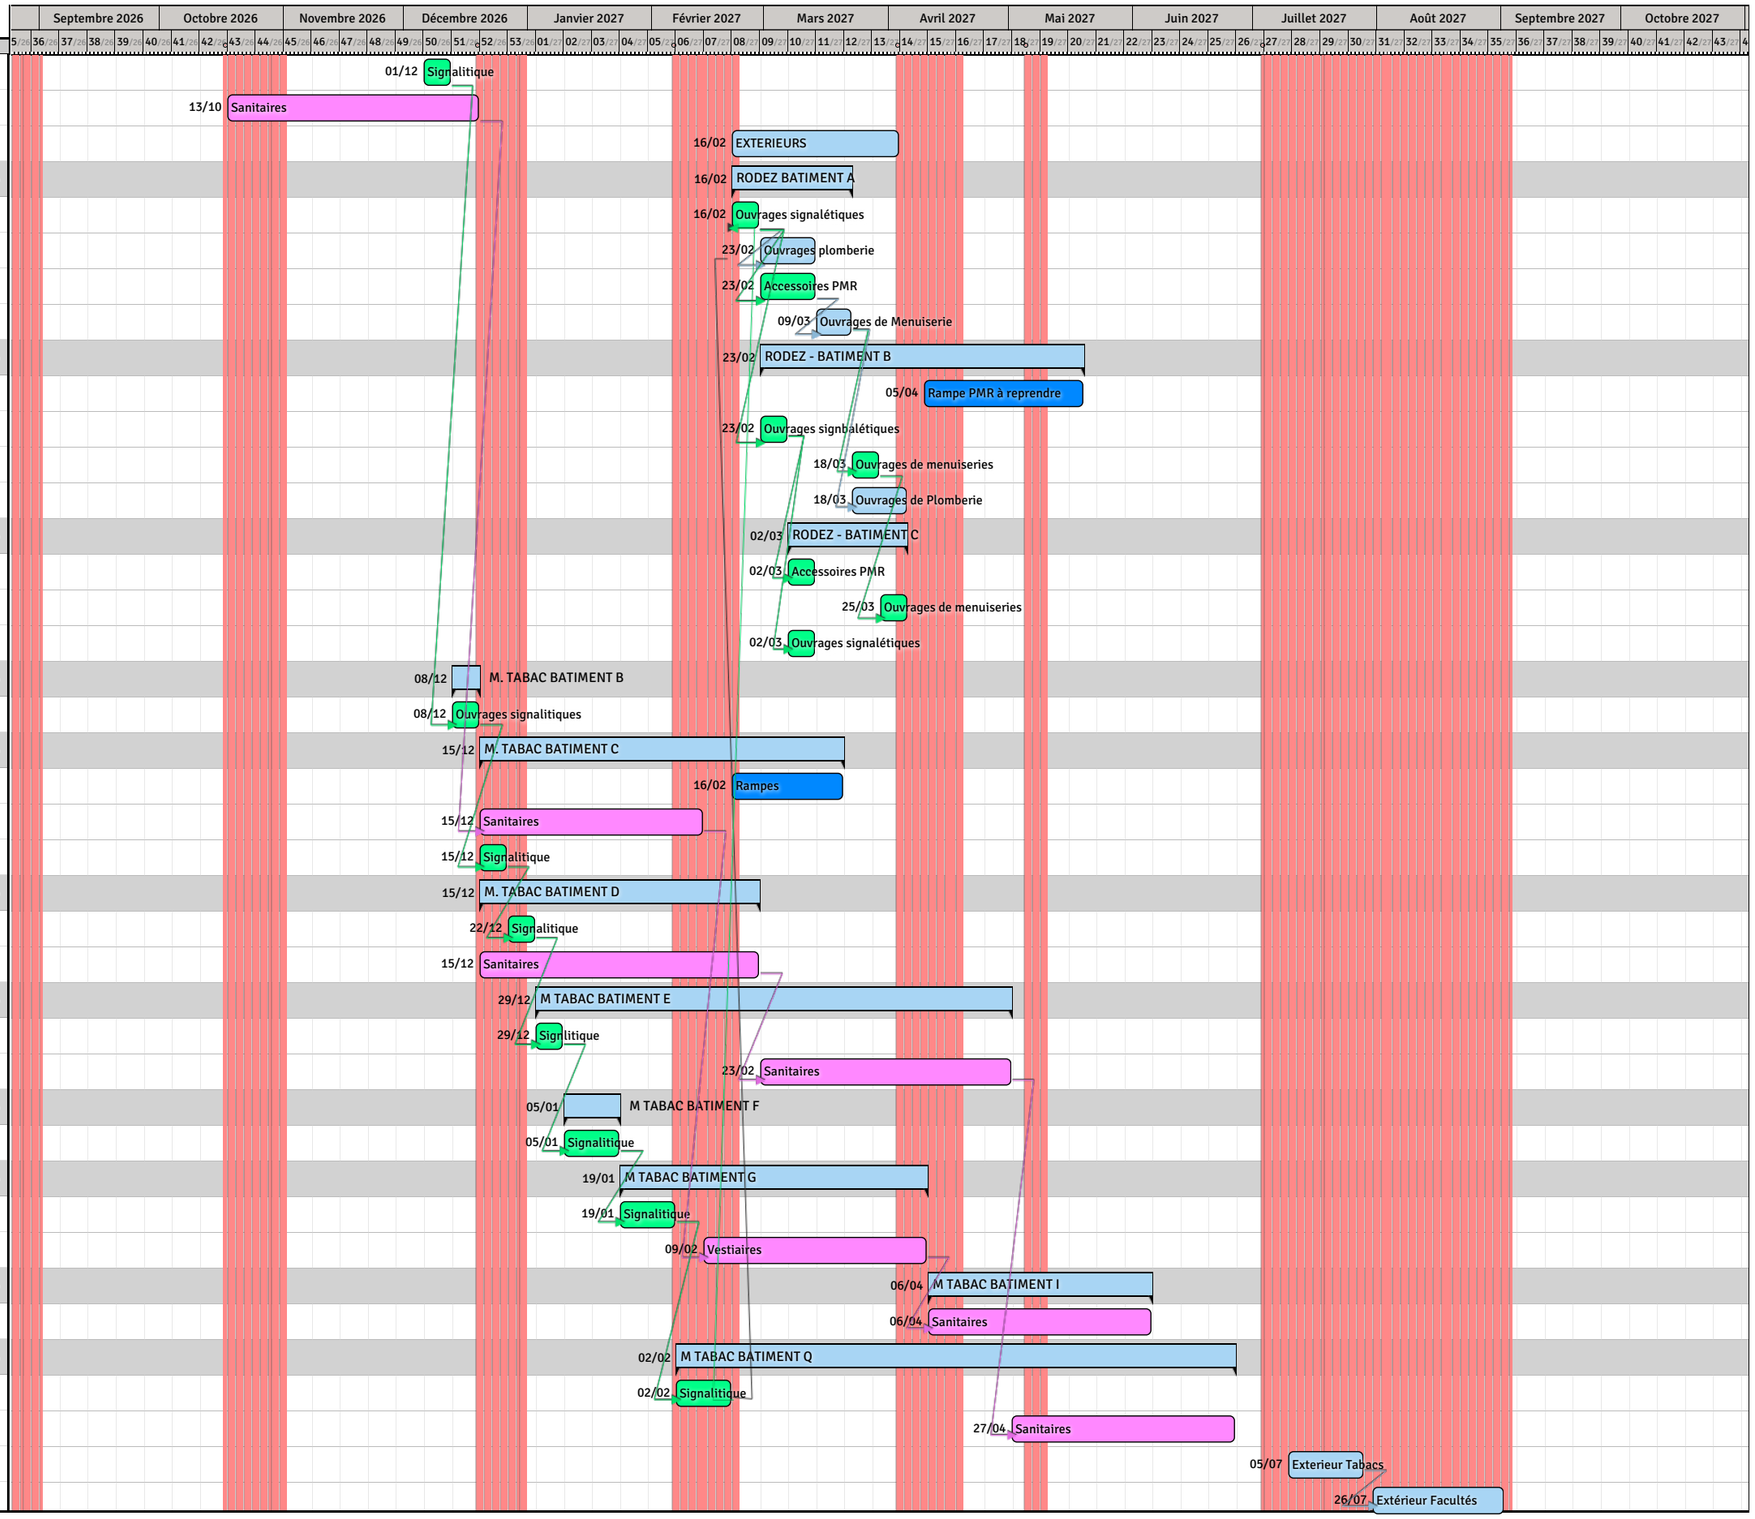
		Début	Fin	Durée	Prédécesseur	Av.
41	Signalitique	01/12/2026	07/12/2026	5J	39FD	0%
42	Sanitaires	13/10/2026	14/12/2026	45J	26FD	0%
43	EXTERIEURS	16/02/2027	29/03/2027	30J	37FD	0%
44	RODEZ BATIMENT A	16/02/2027	17/03/2027	22J		0%
45	Ouvrages signalétiques	16/02/2027	22/02/2027	5J	78FD	0%
46	Ouvrages plomberie	23/02/2027	08/03/2027	10J	45FD	0%
47	Accessoires PMR	23/02/2027	08/03/2027	10J	45FD	0%
48	Ouvrages de Menuiserie	09/03/2027	17/03/2027	7J	47FD	0%
49	RODEZ - BATIMENT B	23/02/2027	14/05/2027	59J		0%
50	Rampe PMR à reprendre	05/04/2027	14/05/2027	30J		0%
51	Ouvrages signbalétiques	23/02/2027	01/03/2027	5J	45FD	0%
52	Ouvrages de menuiseries	18/03/2027	24/03/2027	5J	48FD	0%
53	Ouvrages de Plomberie	18/03/2027	31/03/2027	10J	48FD	0%
54	RODEZ - BATIMENT C	02/03/2027	31/03/2027	22J		0%
55	Accessoires PMR	02/03/2027	08/03/2027	5J	51FD	0%
56	Ouvrages de menuiseries	25/03/2027	31/03/2027	5J	52FD	0%
57	Ouvrages signalétiques	02/03/2027	08/03/2027	5J	51FD	0%
58	M. TABAC BATIMENT B	08/12/2026	14/12/2026	5J		0%
59	Ouvrages signalitiques	08/12/2026	14/12/2026	5J	41FD	0%
60	M. TABAC BATIMENT C	15/12/2026	15/03/2027	65J		0%
61	Rampes	16/02/2027	15/03/2027	20J	37FD	0%
62	Sanitaires	15/12/2026	08/02/2027	40J	42FD	0%
63	Signalitique	15/12/2026	21/12/2026	5J	59FD	0%
64	M. TABAC BATIMENT D	15/12/2026	22/02/2027	50J		0%
65	Signalitique	22/12/2026	28/12/2026	5J	63FD	0%
66	Sanitaires	15/12/2026	22/02/2027	50J		0%
67	M TABAC BATIMENT E	29/12/2026	26/04/2027	85J		0%
68	Signlitique	29/12/2026	04/01/2027	5J	65FD	0%
69	Sanitaires	23/02/2027	26/04/2027	45J	66FD	0%
70	M TABAC BATIMENT F	05/01/2027	18/01/2027	10J		0%
71	Signalitique	05/01/2027	18/01/2027	10J	68FD	0%
72	M TABAC BATIMENT G	19/01/2027	05/04/2027	55J		0%
73	Signalitique	19/01/2027	01/02/2027	10J	71FD	0%
74	Vestiaires	09/02/2027	05/04/2027	40J	62FD	0%
75	M TABAC BATIMENT I	06/04/2027	31/05/2027	40J		0%
76	Sanitaires	06/04/2027	31/05/2027	40J	74FD	0%
77	M TABAC BATIMENT Q	02/02/2027	21/06/2027	100J		0%
78	Signalitique	02/02/2027	15/02/2027	10J	73FD	0%
79	Sanitaires	27/04/2027	21/06/2027	40J	69FD	0%
80	Exterieur Tabacs	05/07/2027	23/07/2027	15J		0%
81	Extérieur Facultés	26/07/2027	27/08/2027	25J	80FD	0%
