N°	Mod Tâch	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		**CMG AMIENS**	**242 jours**	**Lun 30/11/26**	**Jeu 18/11/27**	
2		**Travaux préparatoires OS**	**66 jours**	**Lun 30/11/26**	**Mer 17/03/27**	
3		Réseaux pour cuisine provisoire	10 jours	Lun 30/11/26	Ven 11/12/26	
4		Fondations provisoires	15 jours	Lun 14/12/26	Mar 19/01/27	3
5		dévoiement des réseaux existant sous ex	10 jours	Mer 20/01/27	Mar 02/02/27	4
6		Construction aménagement cuisine provis	45 jours	Lun 30/11/26	Mar 16/02/27	
7		installation cuisine provisoire	21 jours	Mer 17/02/27	Mer 17/03/27	6
8		**Travaux dans existant**	**75 jours**	**Jeu 18/03/27**	**Mer 30/06/27**	
9		purge cuisine existante	15 jours	Jeu 18/03/27	Mer 07/04/27	7
10		désamiantage zone carrellage	21 jours	Jeu 18/03/27	Jeu 15/04/27	7
11		dépose faux plafond zone salle a manger	3 jours	Ven 16/04/27	Mar 20/04/27	10
12		démolition escalier	5 jours	Jeu 18/03/27	Mer 24/03/27	7
13		Percement cuisine existante	10 jours	Jeu 08/04/27	Mer 21/04/27	9
14		Cloisons sandwich	15 jours	Jeu 22/04/27	Mer 12/05/27	13
15		Plancher salle a mangé	30 jours	Jeu 18/03/27	Mer 28/04/27	7
16		CVC	50 jours	Jeu 22/04/27	Mer 30/06/27	13
17		CFO CFA	50 jours	Jeu 22/04/27	Mer 30/06/27	13
18		Menuiseries éxtérieures salla à manger	10 jours	Jeu 29/04/27	Mer 12/05/27	15
19		carrellage	30 jours	Jeu 29/04/27	Mer 09/06/27	15
20		**extension cuisine**	**80 jours**	**Jeu 25/03/27**	**Mer 14/07/27**	
21		terrassement	2 jours	Jeu 25/03/27	Ven 26/03/27	12
22		Micropieux	9 jours	Mer 31/03/27	Lun 12/04/27	7;35
23		recépage	2 jours	Mar 13/04/27	Mer 14/04/27	22
24		Longrine y compris laverie	15 jours	Jeu 15/04/27	Mer 05/05/27	23
25		poteaux rdj	5 jours	Jeu 06/05/27	Mer 12/05/27	24
26		Poutres	5 jours	Jeu 13/05/27	Mer 19/05/27	25
27		plancher bas rdc	4 jours	Jeu 20/05/27	Mar 25/05/27	26
28		élévation RDC	10 jours	Jeu 20/05/27	Mer 02/06/27	26
29		plancher haut rdc	5 jours	Jeu 03/06/27	Mer 09/06/27	28
30		Couverture cuisine	15 jours	Jeu 10/06/27	Mer 30/06/27	29
31		Menuiseries éxtérieures extension	5 jours	Jeu 01/07/27	Mer 07/07/27	30
32		Cloisons sandwich	5 jours	Jeu 01/07/27	Mer 07/07/27	30
33		CVC	25 jours	Jeu 10/06/27	Mer 14/07/27	29
34		**extension laverie**	**138 jours**	**Lun 29/03/27**	**Mer 06/10/27**	
35		Pieux laverie	2 jours	Lun 29/03/27	Mar 30/03/27	21
36		réseaux sous plancher laverie	5 jours	Jeu 06/05/27	Mer 12/05/27	24
37		plancher laverie	5 jours	Jeu 13/05/27	Mer 19/05/27	36
38		élévation laverie compris monte charge	10 jours	Jeu 20/05/27	Mer 02/06/27	37
39		charpente laverie	3 jours	Jeu 03/06/27	Lun 07/06/27	38
40		Couverture étanchéité laverie	10 jours	Mar 08/06/27	Mer 29/09/27	39
41		Cloisons sandwich	5 jours	Jeu 30/09/27	Mer 06/10/27	40
42		Ascenseur	10 jours	Jeu 03/06/27	Mer 16/06/27	38
43		CVC	15 jours	Jeu 30/09/27	Mer 20/10/27	40
44		carrellage	5 jours	Jeu 30/09/27	Mer 06/10/27	40
45		**Travaux généraux**	**50 jours**	**Jeu 10/06/27**	**Mer 18/08/27**	
46		Cloisons sandwich	30 jours	Jeu 10/06/27	Mer 21/07/27	19
47		équipement de cuisine	30 jours	Jeu 08/07/27	Mer 18/08/27	31
48		Travaux de façade	30 jours	Jeu 01/07/27	Mer 11/08/27	30
49		**Passerelle**	**193 jours**	**Lun 30/11/26**	**Ven 10/09/27**	
50		fondation passerelle	10 jours	Lun 30/11/26	Ven 11/12/26	
51		ouverture et VRD paserelle	20 jours	Lun 14/12/26	Mar 26/01/27	50
52		structure métallique paserelle	45 jours	Mer 27/01/27	Ven 10/09/27	51
53		OPR	10 jours	Jeu 21/10/27	Mer 03/11/27	47;46;43
54		Reception	1 jour	Jeu 18/11/27	Jeu 18/11/27	53FD+10 jours

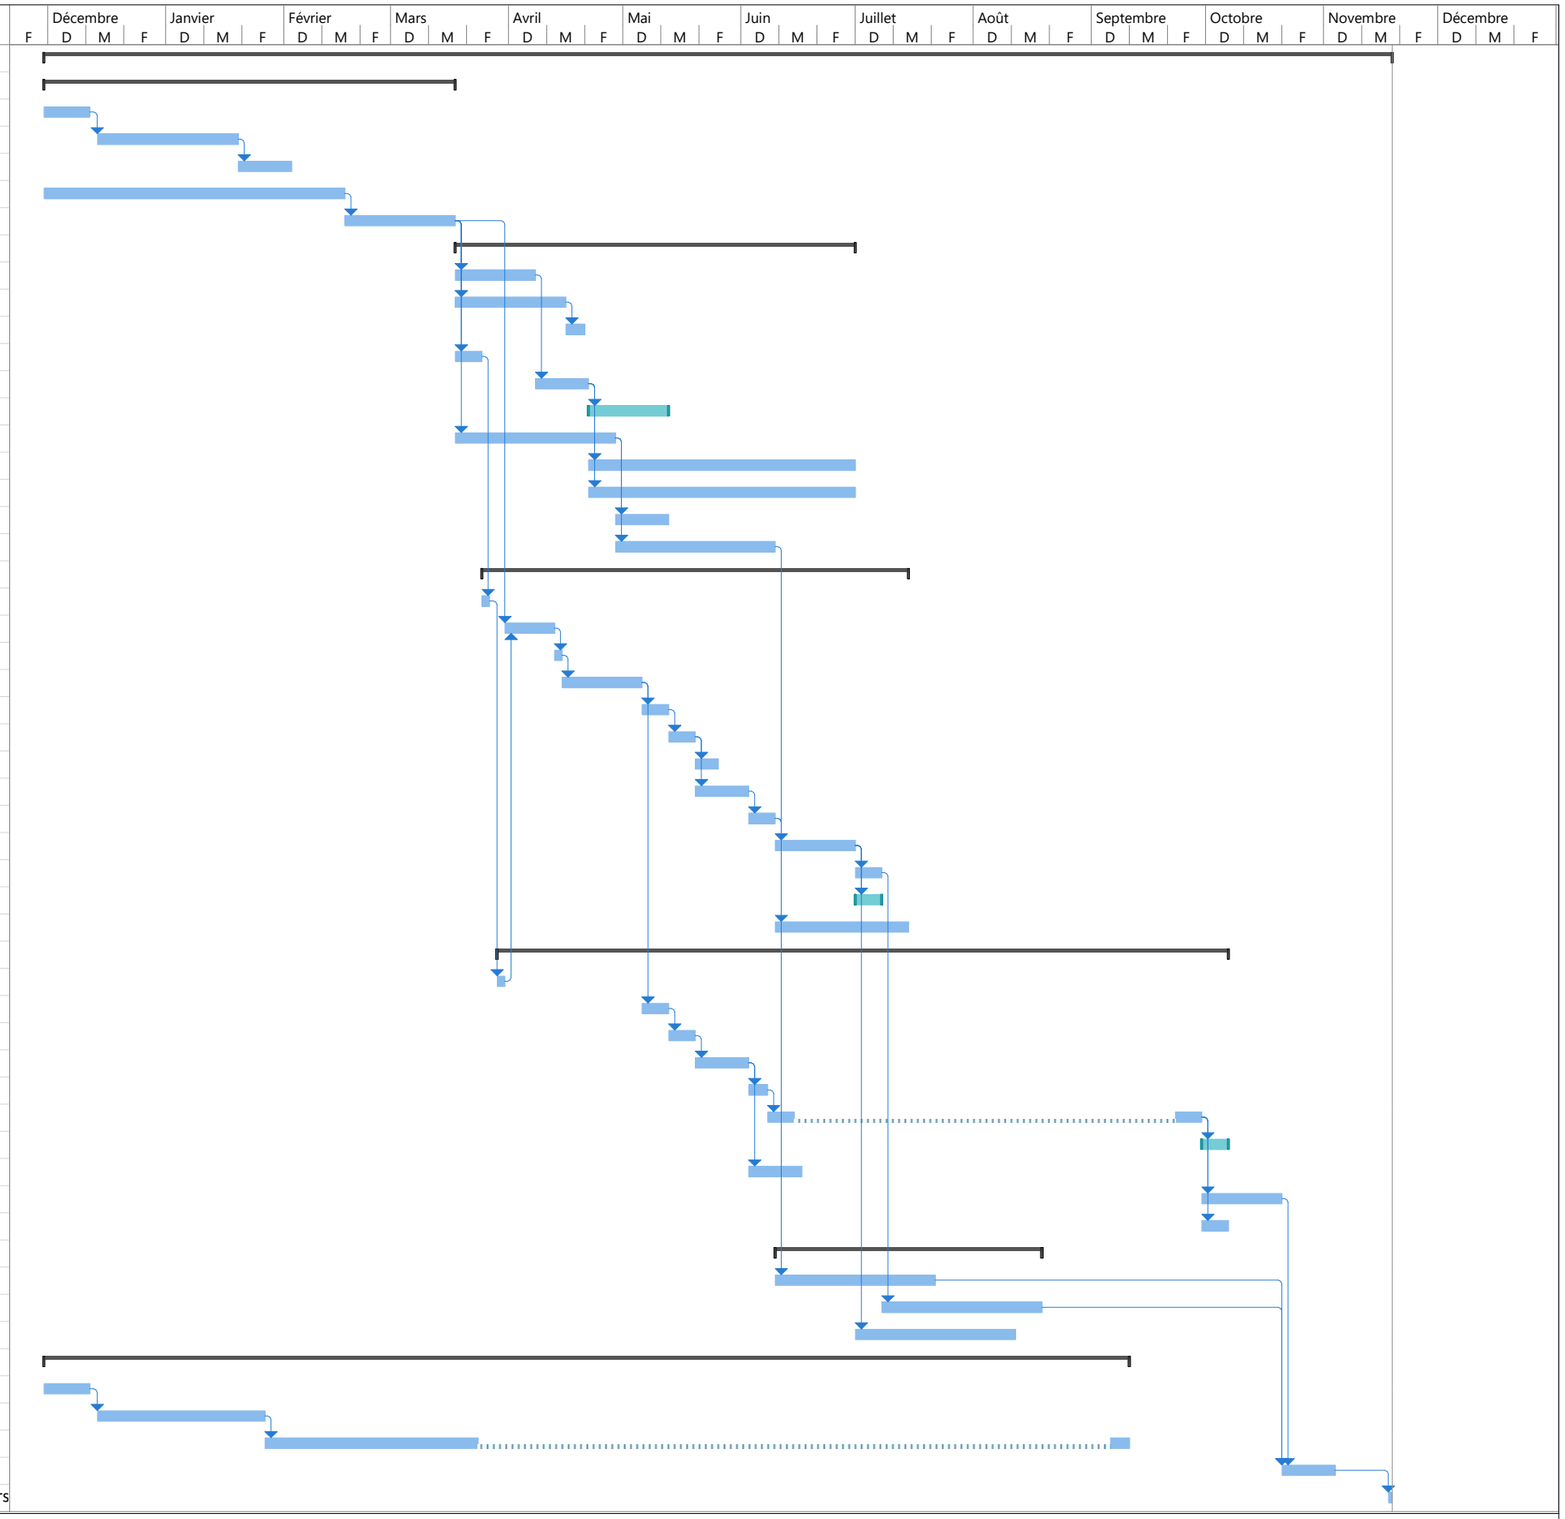

Projet : planning APD ind A
Date : Lun 28/09/26

Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			
