REHABILITATION DU BÂTIMENT CARPEAUX - PLANNING ETUDES et TRAVAUX DE LA NOUVELLE TRANCHE FERME
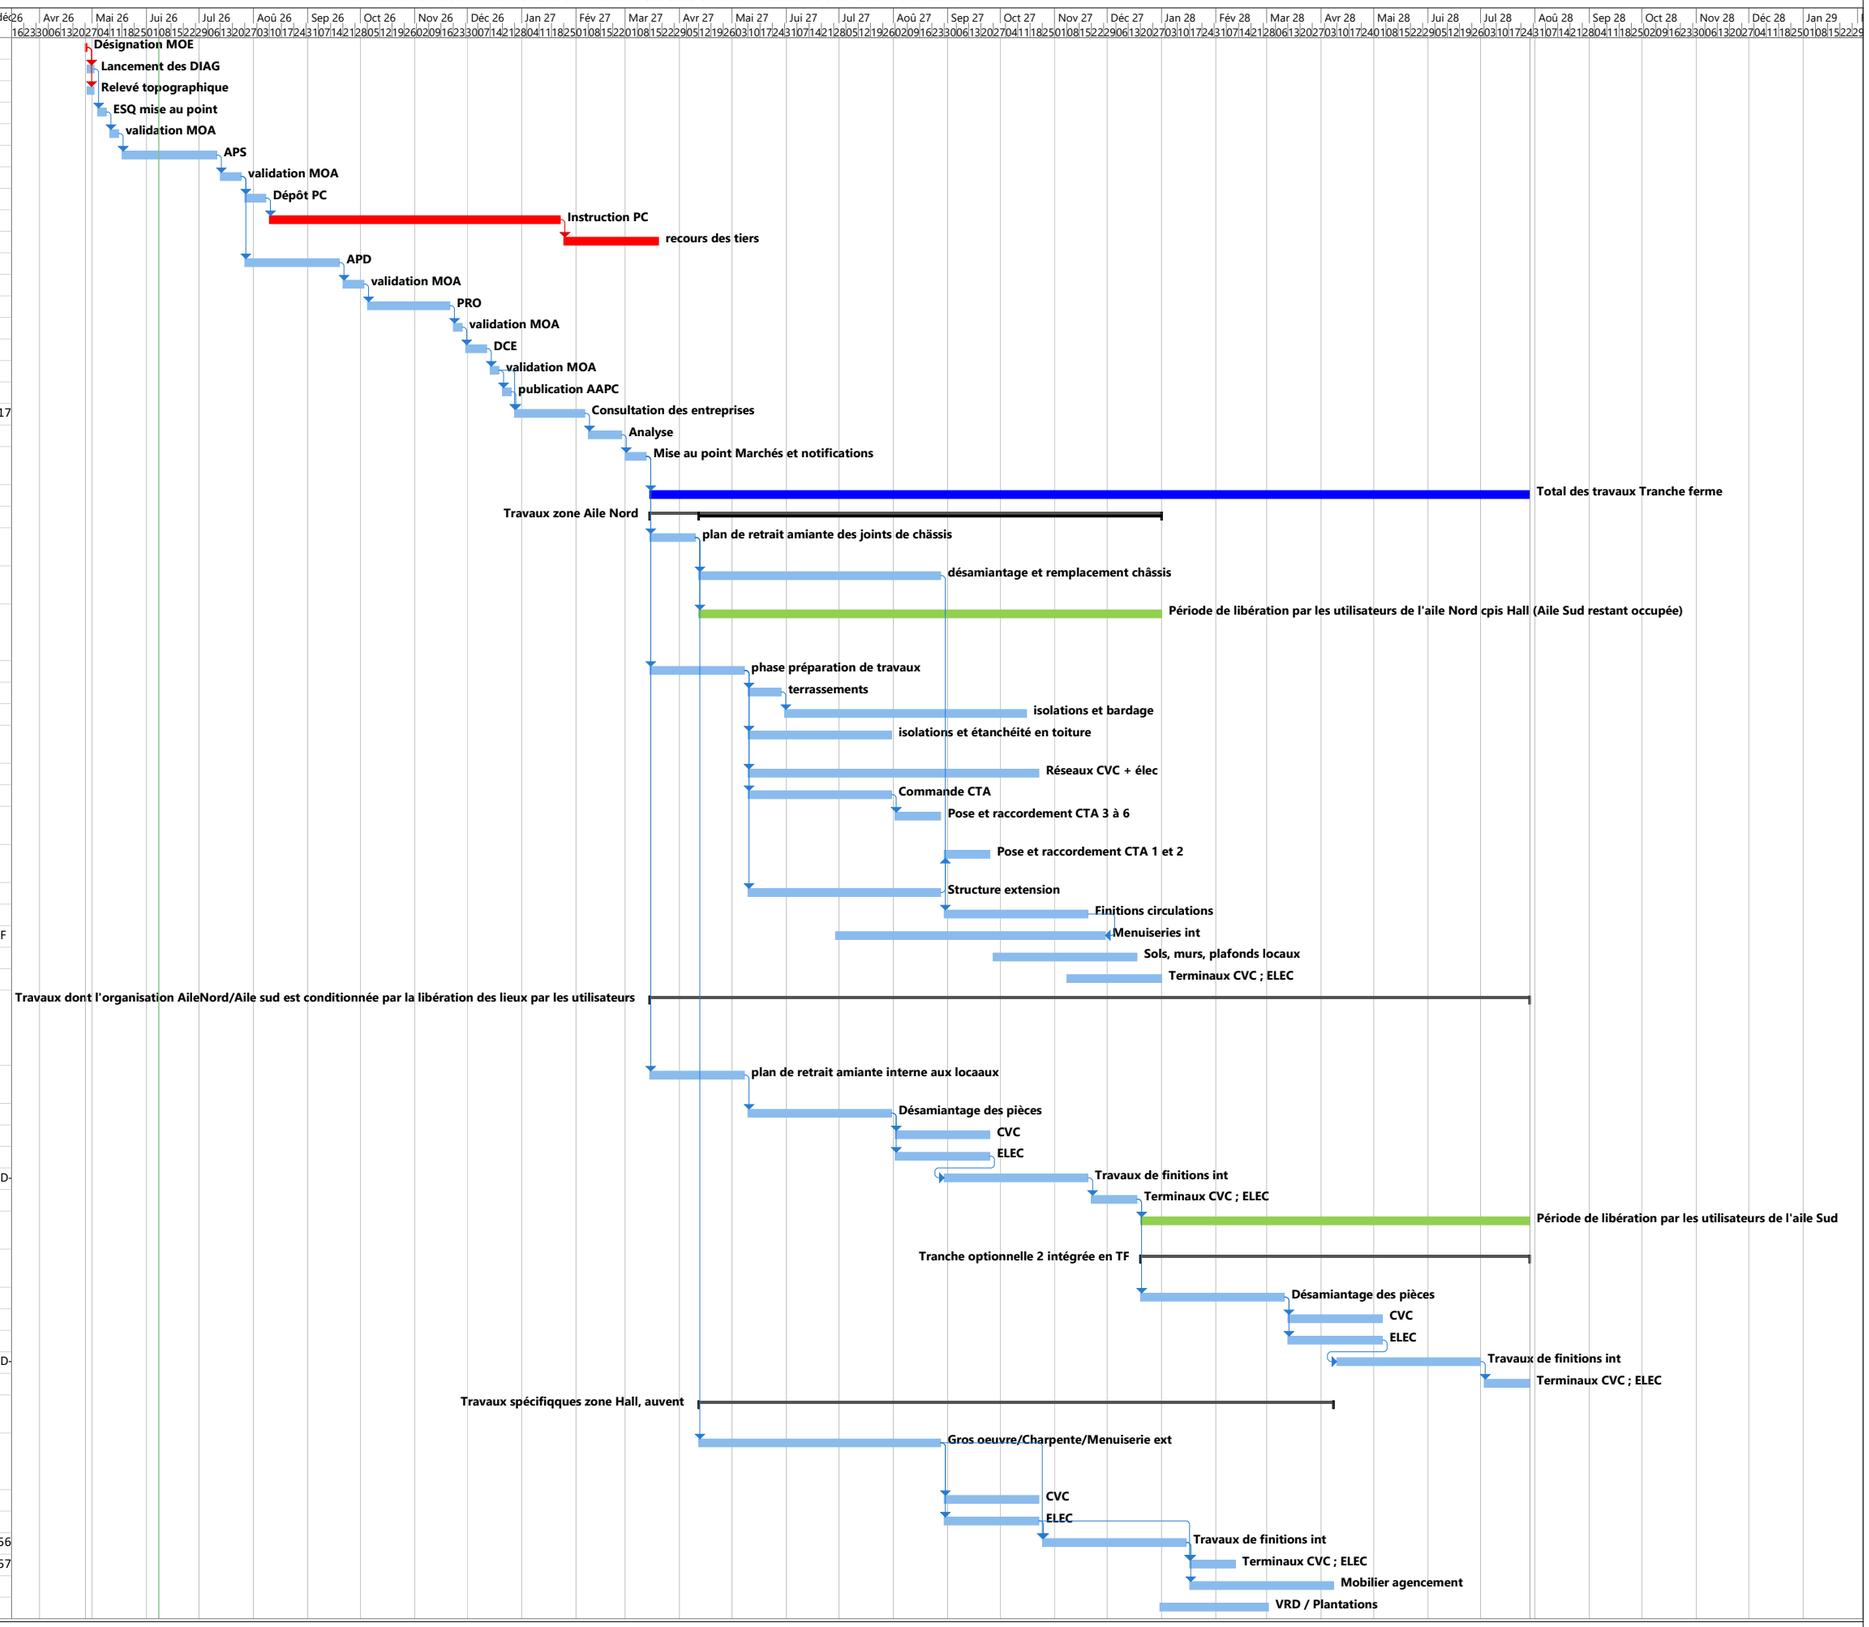
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédé
1		Désignation MOE	1 jour?	Lun 27/04/26	Lun 27/04/26	
2		Lancement des DIAG	4 jours	Mar 28/04/2	Ven 01/05/26	1
3		Relevé topographique	4 jours	Mar 28/04/2	Ven 01/05/26	1
4		ESQ mise au point	1 semaine	Lun 04/05/26	Ven 08/05/26	2
5		validation MOA	1 semaine	Lun 11/05/26	Ven 15/05/26	4
6		APS	8 semaines	Lun 18/05/26	Ven 10/07/26	5
7		validation MOA	2 semaines	Lun 13/07/26	Ven 24/07/26	6
8		Dépôt PC	2 semaines	Lun 27/07/26	Ven 07/08/26	7
9		Instruction PC	6 mois	Lun 10/08/26	Ven 22/01/27	8
10		recours des tiers	2 mois	Lun 25/01/27	Ven 19/03/27	9
11		APD	8 semaines	Lun 27/07/26	Ven 18/09/26	7
12		validation MOA	2 semaines	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26	11
13		PRO	7 semaines	Lun 05/10/26	Ven 20/11/26	12
14		validation MOA	1 semaine	Lun 23/11/26	Ven 27/11/26	13
15		DCE	2 semaines	Lun 30/11/26	Ven 11/12/26	14
16		validation MOA	1 semaine	Lun 14/12/26	Ven 18/12/26	15
17		publication AAPC	1 semaine	Lun 21/12/26	Ven 25/12/26	16
18		Consultation des entreprises	6 semaines	Lun 28/12/26	Ven 05/02/27	16;17
19		Analyse	3 semaines	Lun 08/02/27	Ven 26/02/27	18
20		Mise au point Marchés et notifications	2 semaines	Lun 01/03/27	Ven 12/03/27	19
21		**Total des travaux Tranche ferme**	360 jours	Lun 15/03/27	Ven 28/07/28	20
22		**Travaux zone Aile Nord**	**210 jours**	**Lun 15/03/27**	**Ven 31/12/27**	
23		plan de retrait amiante des joints de châssis	1 mois	Lun 15/03/27	Ven 09/04/27	20
24		désamiantage et remplacement châssis	5 mois	Lun 12/04/27	Ven 27/08/27	23
25		**Période de libération par les utilisateurs de l'aile Nord cpis Hall (Aile Sud restant occupée)**	190 jours	Lun 12/04/27	Ven 31/12/27	23
26		phase préparation de travaux	2 mois	Lun 15/03/27	Ven 07/05/27	20
27		terrassements	3 semaines	Lun 10/05/27	Ven 28/05/27	26
28		isolations et bardage	5 mois	Lun 31/05/27	Ven 15/10/27	27
29		isolations et étanchéité en toiture	3 mois	Lun 10/05/27	Ven 30/07/27	26
30		Réseaux CVC + élec	6 mois	Lun 10/05/27	Ven 22/10/27	26
31		Commande CTA	3 mois	Lun 10/05/27	Ven 30/07/27	26
32		Pose et raccordement CTA 3 à 6	1 mois	Lun 02/08/27	Ven 27/08/27	31
33		Pose et raccordement CTA 1 et 2	1 mois	Lun 30/08/27	Ven 24/09/27	34
34		Structure extension	4 mois	Lun 10/05/27	Ven 27/08/27	26
35		Finitions circulations	3 mois	Lun 30/08/27	Ven 19/11/27	24
36		Menuiseries int	110 jours	Mar 29/06/2	Lun 29/11/27	35FF
37		Sols, murs, plafonds locaux	3 mois	Lun 27/09/27	Ven 17/12/27	
38		Terminaux CVC ; ELEC	2 mois	Lun 08/11/27	Ven 31/12/27	
39		**Travaux dont l'organisation AileNord/Aile sud est conditionnée par la libération des lieux par les utilisateurs**	**360 jours**	**Lun 15/03/27**	**Ven 28/07/28**	
40		plan de retrait amiante interne aux locaaux	2 mois	Lun 15/03/27	Ven 07/05/27	20
41		Désamiantage des pièces	3 mois	Lun 10/05/27	Ven 30/07/27	40
42		CVC	2 mois	Lun 02/08/27	Ven 24/09/27	41
43		ELEC	2 mois	Lun 02/08/27	Ven 24/09/27	41
44		Travaux de finitions int	3 mois	Lun 30/08/27	Ven 19/11/27	43FD-
45		Terminaux CVC ; ELEC	1 mois	Lun 22/11/27	Ven 17/12/27	44
46		Période de libération par les utilisateurs de l'aile Sud	160 jours	Lun 20/12/27	Ven 28/07/28	45
47		**Tranche optionnelle 2 intégrée en TF**	**160 jours**	**Lun 20/12/27**	**Ven 28/07/28**	
48		Désamiantage des pièces	3 mois	Lun 20/12/27	Ven 10/03/28	45
49		CVC	2 mois	Lun 13/03/28	Ven 05/05/28	48
50		ELEC	2 mois	Lun 13/03/28	Ven 05/05/28	48
51		Travaux de finitions int	3 mois	Lun 10/04/28	Ven 30/06/28	50FD-
52		Terminaux CVC ; ELEC	1 mois	Lun 03/07/28	Ven 28/07/28	51
53		**Travaux spécifiqques zone Hall, auvent**	**260 jours**	**Lun 12/04/27**	**Ven 07/04/28**	
54		Gros oeuvre/Charpente/Menuiserie ext	5 mois	Lun 12/04/27	Ven 27/08/27	23
55		CVC	2 mois	Lun 30/08/27	Ven 22/10/27	54
56		ELEC	2 mois	Lun 30/08/27	Ven 22/10/27	54
57		Travaux de finitions int	3 mois	Lun 25/10/27	Ven 14/01/28	54;56
58		Terminaux CVC ; ELEC	1 mois	Lun 17/01/28	Ven 11/02/28	56;57
59		Mobilier agencement	3 mois	Lun 17/01/28	Ven 07/04/28	57
60		VRD / Plantations	2,2 mois	Ven 31/12/27	Mer 01/03/28
