
| N° | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | **PRÉPARATION DE CHANTIER** | **41 jours** | **Lun 15/02/27** | **Lun 12/04/27** |
| 3 | Réunion de lancement | 0 jour | Lun 15/02/27 | Lun 15/02/27 |
| 4 | Études d'exécution | 14 jours | Lun 15/02/27 | Jeu 04/03/27 |
| 5 | Analyse et visa des documents d'exécution | 10 jours | Ven 05/03/27 | Jeu 18/03/27 |
| 6 | Commande des équipements | 15 jours | Ven 19/03/27 | Jeu 08/04/27 |
| 7 | Coordination avec le MOA des coupures et basculements | 2 jours | Ven 09/04/27 | Lun 12/04/27 |
| 8 | | | | |
| 9 | **TRAVAUX** | **73 jours** | **Mar 13/04/27** | **Jeu 22/07/27** |
| 10 | **INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER** | **5 jours** | **Mar 13/04/27** | **Lun 19/04/27** |
| 11 | Installation de chantier | 3 jours | Mar 13/04/27 | Jeu 15/04/27 |
| 12 | Approvisionnement du chantier | 2 jours | Ven 16/04/27 | Lun 19/04/27 |
| 13 | **TRAVAUX PREPARATOIRES** | **18 jours** | **Mar 20/04/27** | **Jeu 13/05/27** |
| 14 | Repérage des réseaux existants | 1 jour | Mar 20/04/27 | Mar 20/04/27 |
| 15 | Arrêt de la production ECS existante | 0 jour | Mar 20/04/27 | Mar 20/04/27 |
| 16 | Consignations et mises en sécurité | 2 jours | Mer 21/04/27 | Jeu 22/04/27 |
| 17 | Déposes des équipements et réseaux existants | 15 jours | Ven 23/04/27 | Jeu 13/05/27 |
| 18 | **REALISATION DES PRODUCTIONS ECS** | **35 jours** | **Ven 30/04/27** | **Jeu 17/06/27** |
| 19 | Pose des ballons et accessoires associés | 35 jours | Ven 30/04/27 | Jeu 17/06/27 |
| 20 | Raccordement hydraulique des ballons | 35 jours | Ven 30/04/27 | Jeu 17/06/27 |
| 21 | **ELECTRICITE - REGULATION - SUPERVISION** | **45 jours** | **Ven 21/05/27** | **Jeu 22/07/27** |
| 22 | Raccordement électrique des équipements | 25 jours | Ven 21/05/27 | Jeu 24/06/27 |
| 23 | Pose des équipements de régulation et de comptage dans les armoires divisionnaires | 20 jours | Ven 28/05/27 | Jeu 24/06/27 |
| 24 | Raccordement des installations de régulation et de comptage à la GTC | 5 jours | Ven 25/06/27 | Jeu 01/07/27 |
| 25 | Paramétrage et intégration dans la GTC | 15 jours | Ven 02/07/27 | Jeu 22/07/27 |
| 26 | **ESSAIS ET MISE EN SERVICE** | **15 jours** | **Jeu 24/06/27** | **Jeu 15/07/27** |
| 27 | Mise en service provisoire | 0 jour | Jeu 24/06/27 | Jeu 24/06/27 |
| 28 | Essais hydrauliques & électriques | 5 jours | Ven 25/06/27 | Jeu 01/07/27 |
| 29 | Vérification des remontées GTB / GTC | 5 jours | Ven 02/07/27 | Jeu 08/07/27 |
| 30 | Essais fonctionnels de l'ensemble de l'installation | 5 jours | Ven 09/07/27 | Jeu 15/07/27 |
| 31 | Mise en service définitive | 0 jour | Jeu 15/07/27 | Jeu 15/07/27 |
| 32 | | | | |
| 33 | **RÉCEPTION DES TRAVAUX** | **29 jours** | **Ven 02/07/27** | **Mer 11/08/27** |
| 34 | Autocontrôles de l'entreprise | 2 jours | Ven 02/07/27 | Lun 05/07/27 |
| 35 | Nettoyage final des locaux et installations | 3 jours | Ven 16/07/27 | Mar 20/07/27 |
| 36 | Formation de l'exploitant | 1 jour | Mer 21/07/27 | Mer 21/07/27 |
| 37 | Opérations préalables à la réception (OPR) | 0 jour | Mer 21/07/27 | Mer 21/07/27 |
| 38 | Correction des non-conformités le cas échéant | 15 jours | Jeu 22/07/27 | Mer 11/08/27 |
| 39 | Réception des travaux | 0 jour | Mer 11/08/27 | Mer 11/08/27 |

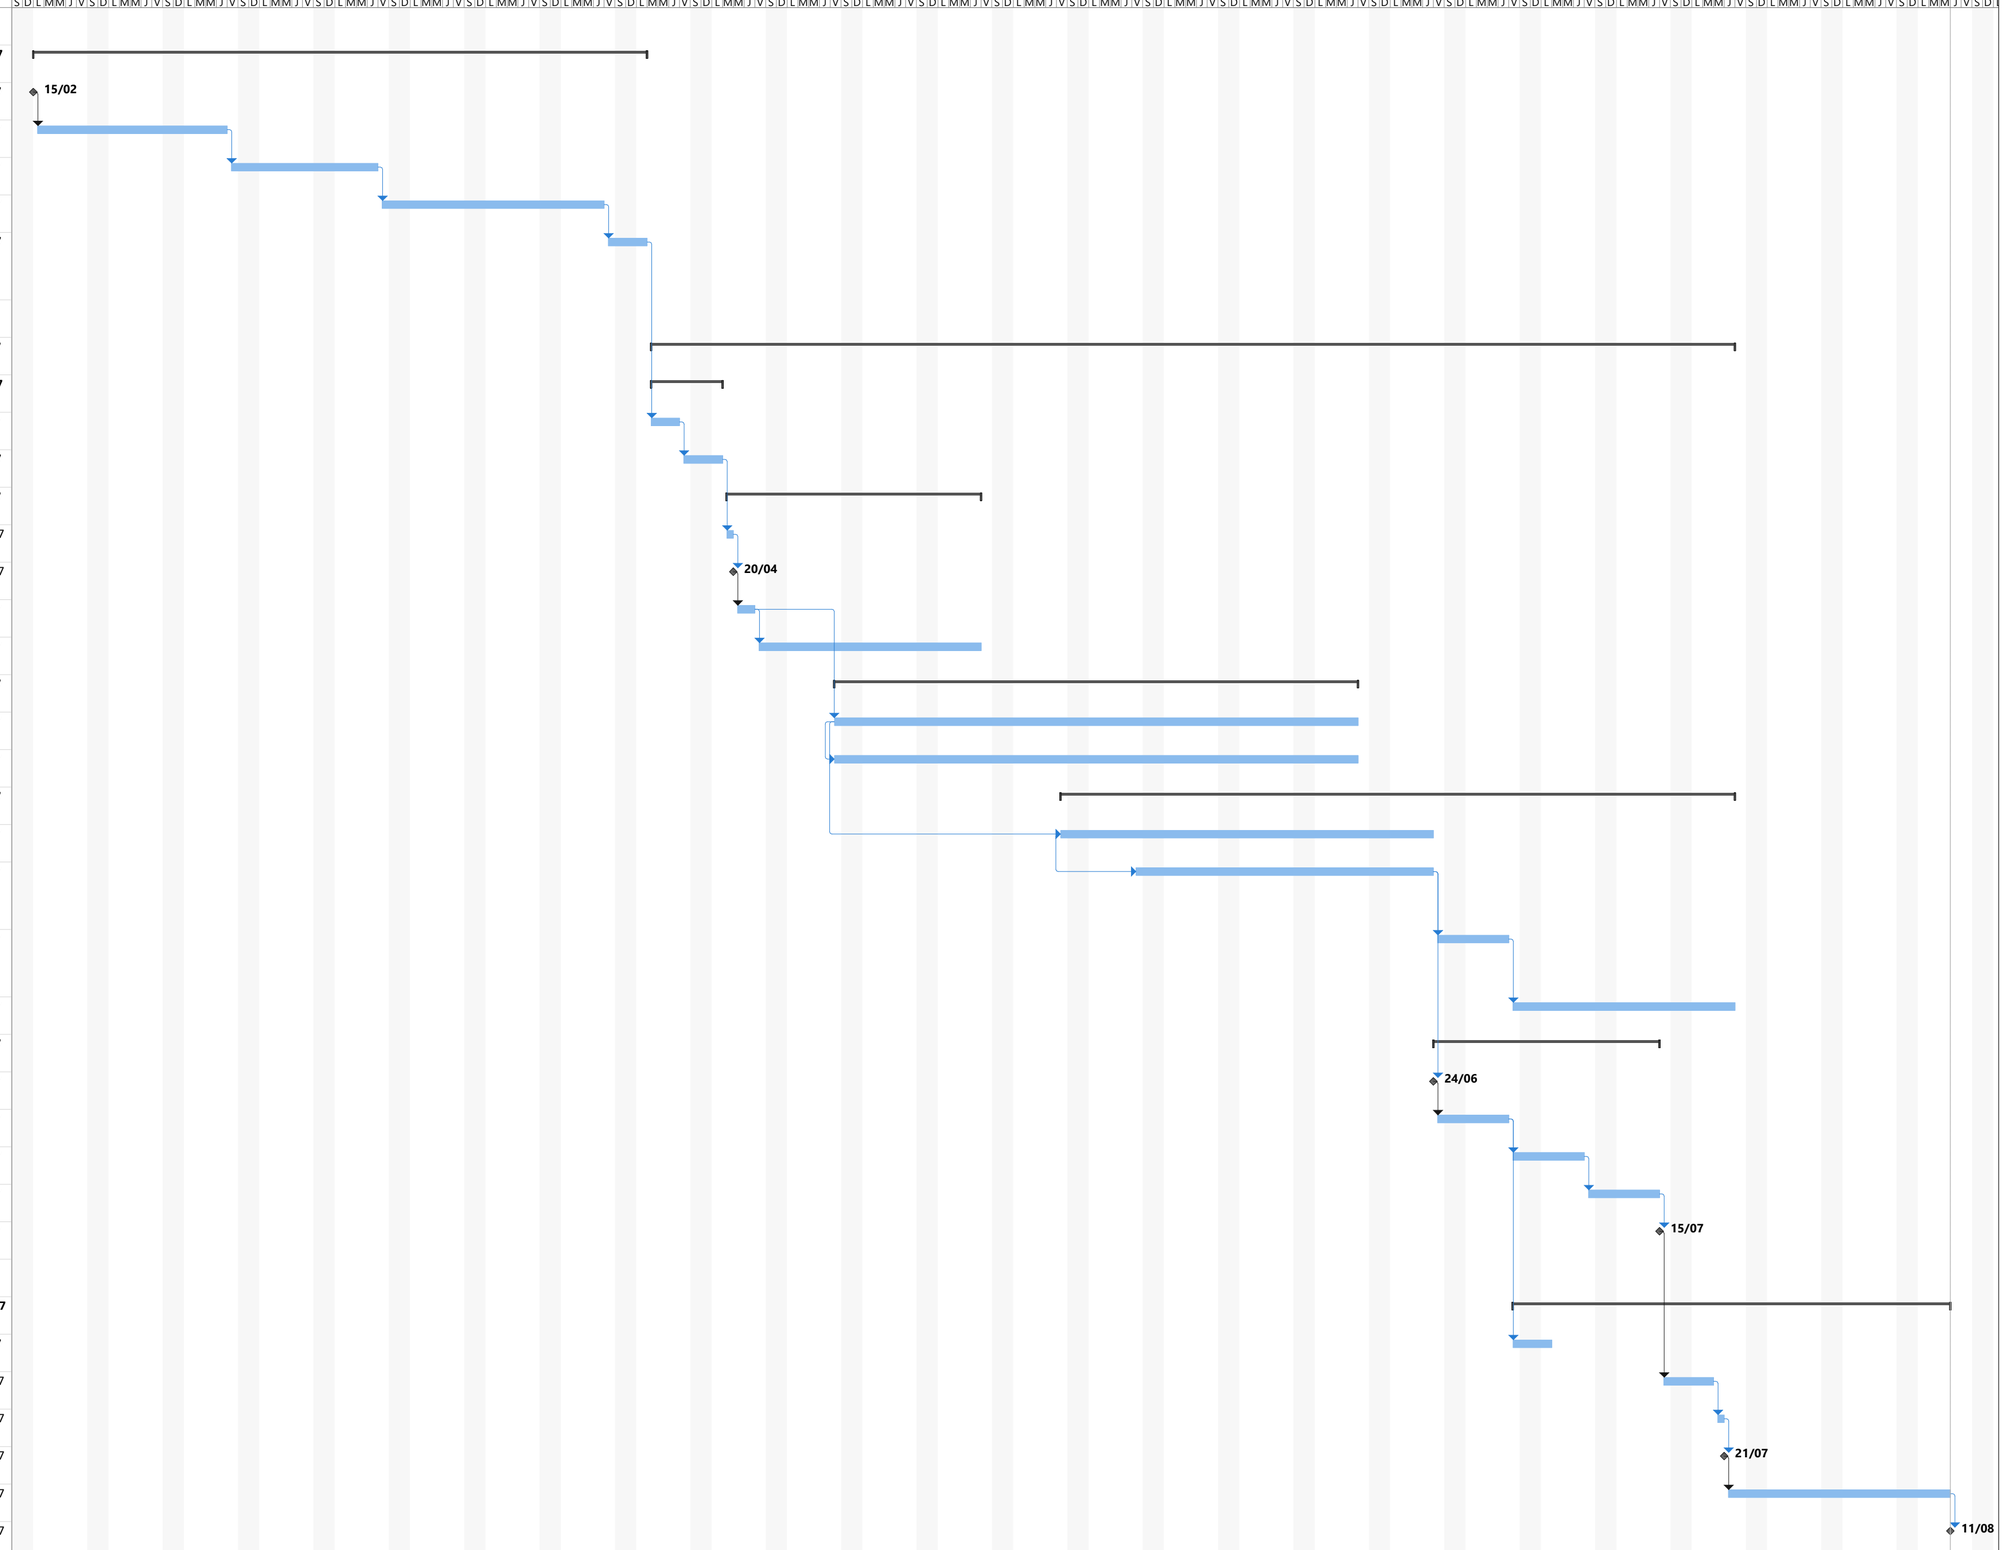


Projet : Planning_Trvx production ECS_UIOSP 24_V.1.mpp
Ven 06/11/26

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tâche | Tâche inactive | Report récapitulatif manuel | Jalons externes | Chemin de la tâche récapitulative du prédécesseur p | Progression manuelle | | |
| Fractionnement | Jalon inactif | Récapitulatif manuel | Échéance | Planning de référence | | | |
| Jalon | Récapitulatif inactif | Début uniquement | Chemin de la tâche de jalon du prédécesseur pilotan | Jalon de référence | | | |
| Récapitulative | Tâche manuelle | Fin uniquement | Chemin de la tâche récapitulative du prédécesseur p | Récapitulatif de référence | | | |
| Récapitulatif du projet | Durée uniquement | Tâches externes | Chemin de la tâche de jalon du prédécesseur pilotan | Avancement | | | |
