sce
Aménagement & environnement

Projet de construction d'un écran acoustique au Mesnil-Amelot

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Prédécesseurs
1		**Période de préparation**	40 jours	
2		Commande des panneaux acoustiques	20 jours	
3		Commande des poteaux HEA	20 jours	
4		Préfabrication des panneaux acoustiques	112 jours	2
5		**Installation de chantier**	5 jours	1
6		**Travaux préparatoires**	**5 jours**	
7		Signalisation provisoire : effacement marquage / MeO marquage provisoire	3 jours	5DD
8		Déconstruction GBA / Dépose glissières métalliques	2 jours	7
9		Mise en oeuvre SMV en bord de voie	2 jours	7
10		Création voie provisoire derrière GBA / Dépose clôture / MeO clôture provisoire	2 jours	7
11		**Débroussaillage et Terrassement**	**15 jours**	
12		Débroussaillage	2 jours	10DD
13		Décapage de la terre végétale	3 jours	12
14		Terrassement remblais/déblais	10 jours	13
15		Création des plateformes	10 jours	14DD
16		**Travaux de fondation**	**80 jours**	
17		Réalisation des micropieux	75 jours	15
18		Réalisation longrine + mise en place des ancrages de fixation	50 jours	17DD+30 jours
19		**Superstructures et aménagements**	**35 jours**	
20		Pose poteaux et panneaux + réglages	30 jours	18DD+30 jours
21		Pose grillage + peinture sur poteaux	10 jours	20DD+20 jours
22		Plantation côté RD212	25 jours	20DD+10 jours
23		**Equipements de la route [travaux de nuit]**	**7 jours**	**22**
24		Phase 4 : reprise marquage / ripage SMV	1 jour	19
25		Phase 4 : GBA extrudée / Glissières métalliques	3 jours	24
26		Phase 5 : repli SMV / marquage définitif	2 jours	25
27		**Remise en état après travaux**	**5 jours**	
28		Piste définitive d'exploitation	3 jours	26
29		Nettoyage des emprises et repli	2 jours	28

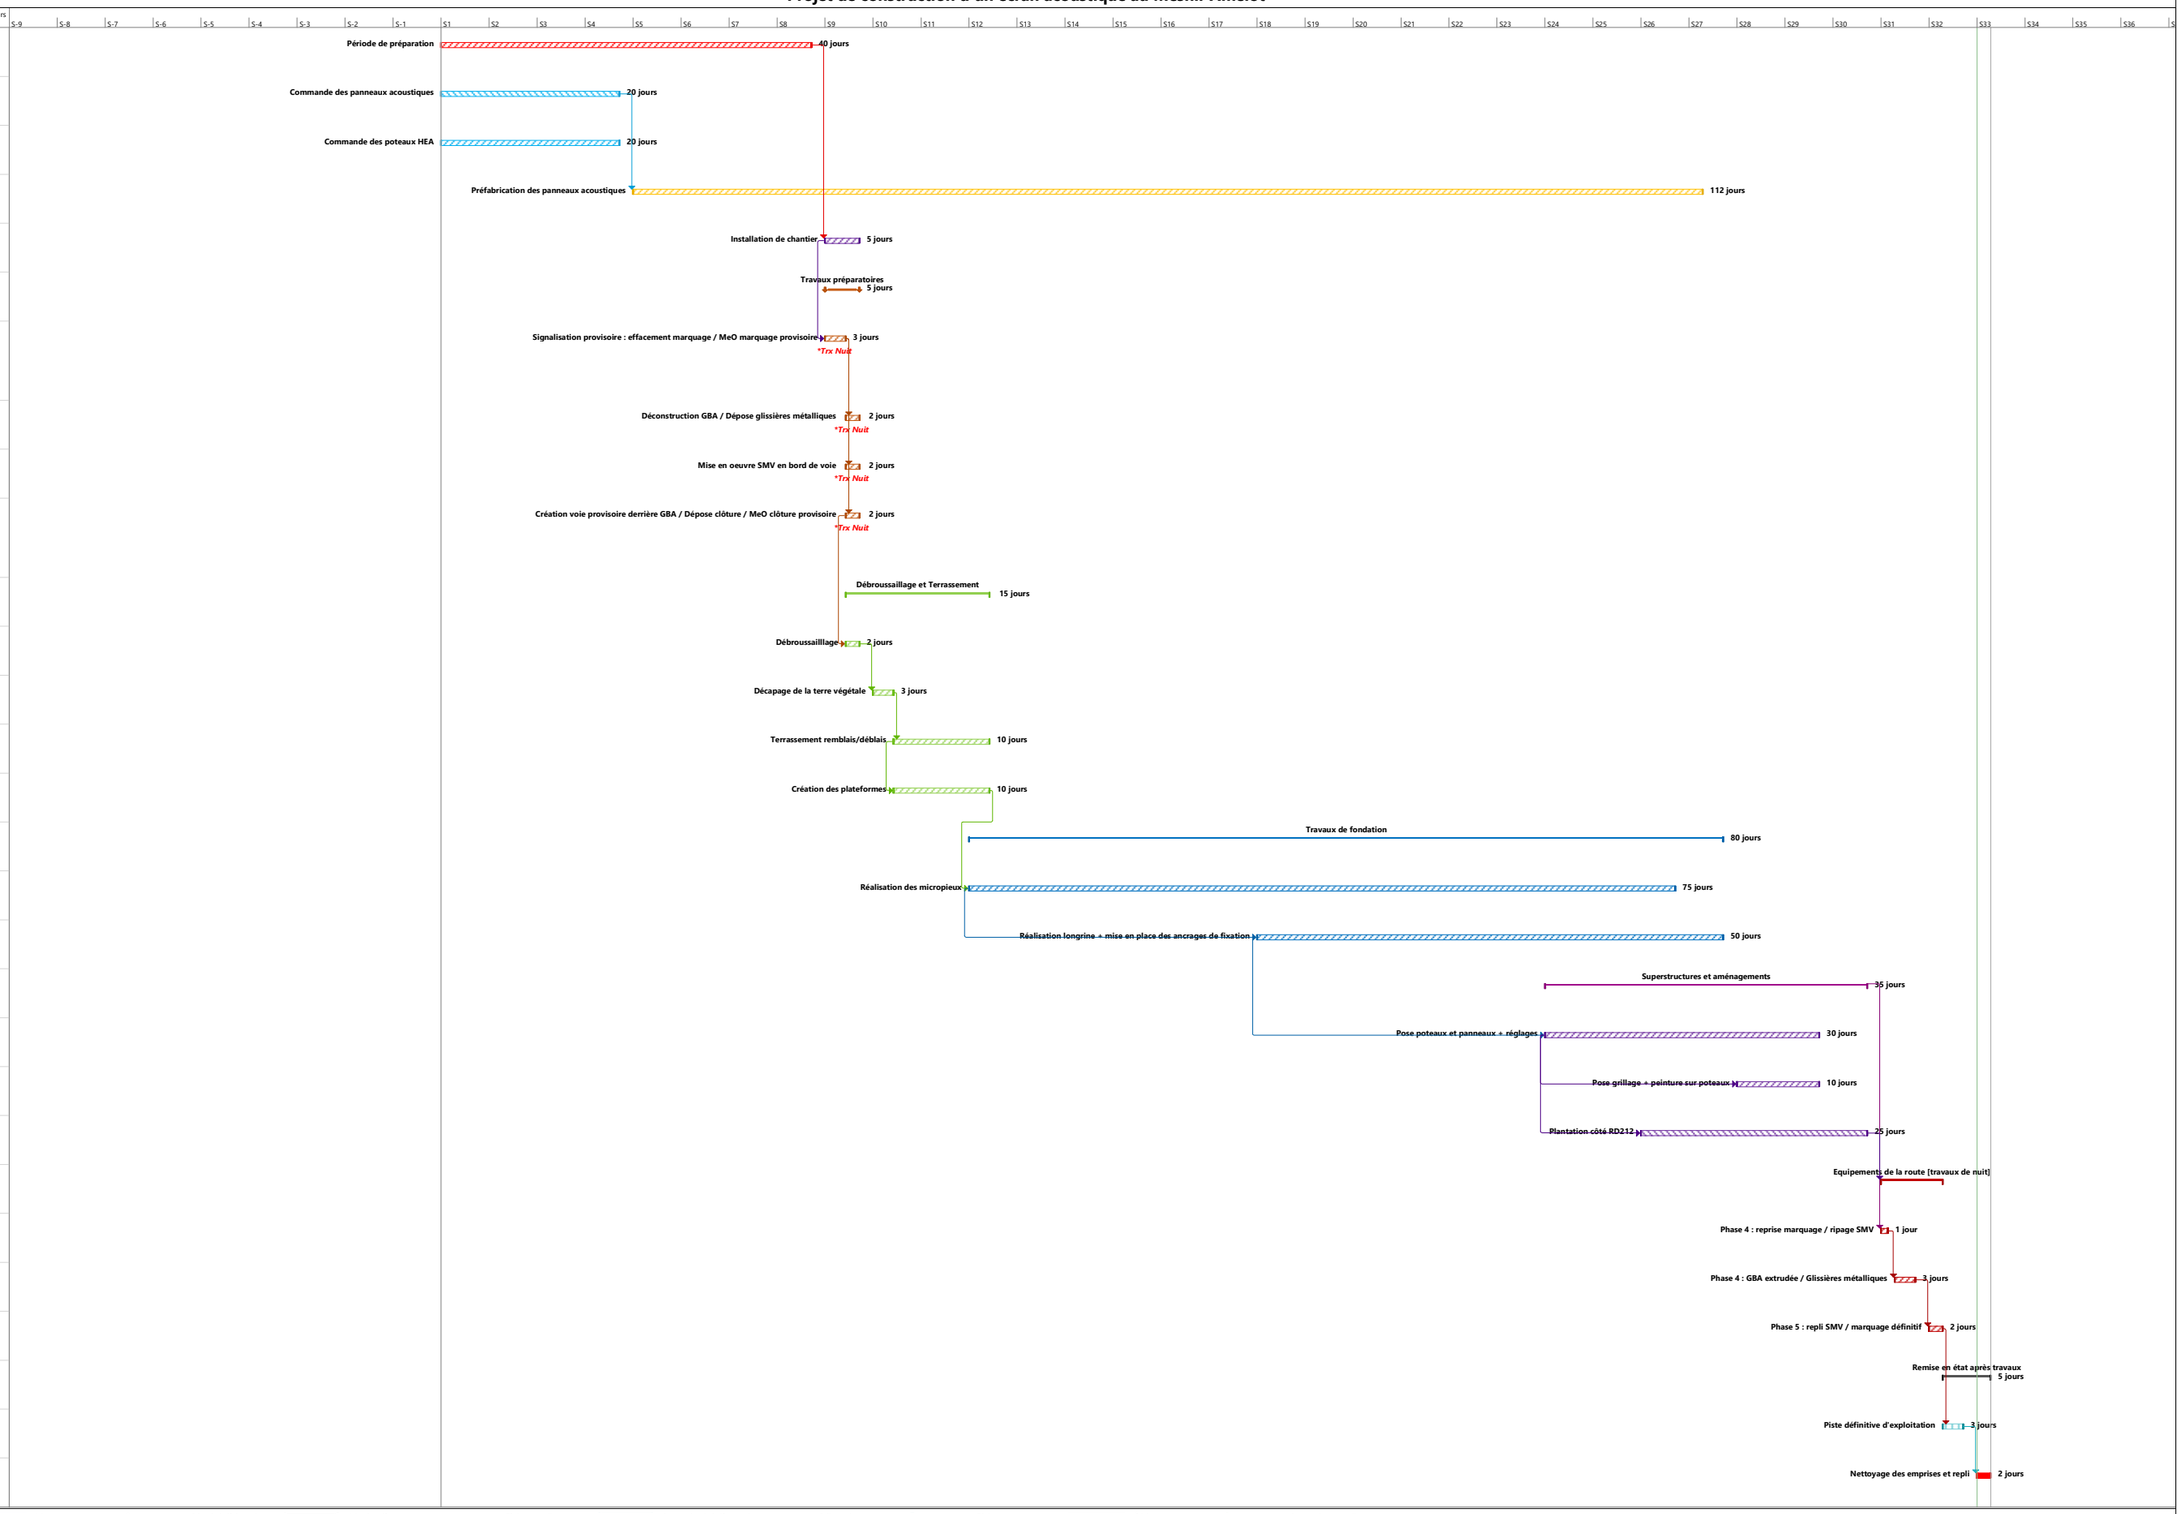

Projet : Projet1
Date : Lun 30/03/26

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Échéance · Avancement · Progression manuelle
